

생활 속 거리두기로 코로나19 바이러스 감염병을 극복합시다!

서울교통공사

Move the City

수신 수신자 참조

(경유)

제목 김용석 시의원(행정자치위원회, 더불어민주당) 서면질문서 제출

1. 서울시 기획담당관-8740(2020. 6. 17.) 김용석, 최기찬 시의원 서면질문서 송부와 관련입니다.
2. 창동역 엘리베이터 설치 관련 김용석 시의원 서면질문서 답변자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 창동역 환승 엘리베이터 설치 보고서 1부. 끝.

서울교통공사사장

수신자 서울특별시 의회사무처장(의사담당관), 서울특별시장(기획담당관)

차장

부장

처장

실장

협조자


시행 대외협력처-1270 (2020.06.18.) 접수 의사담당관-3233 (2020.6.18.)
우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346 / www.seoulmetro.co.kr
전화 6311-9047 /전송 / feel9214@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

창동역 환승 E/L 설치 관련 도면 및 사진

4호선 승강장 내부



1호선 환승계단

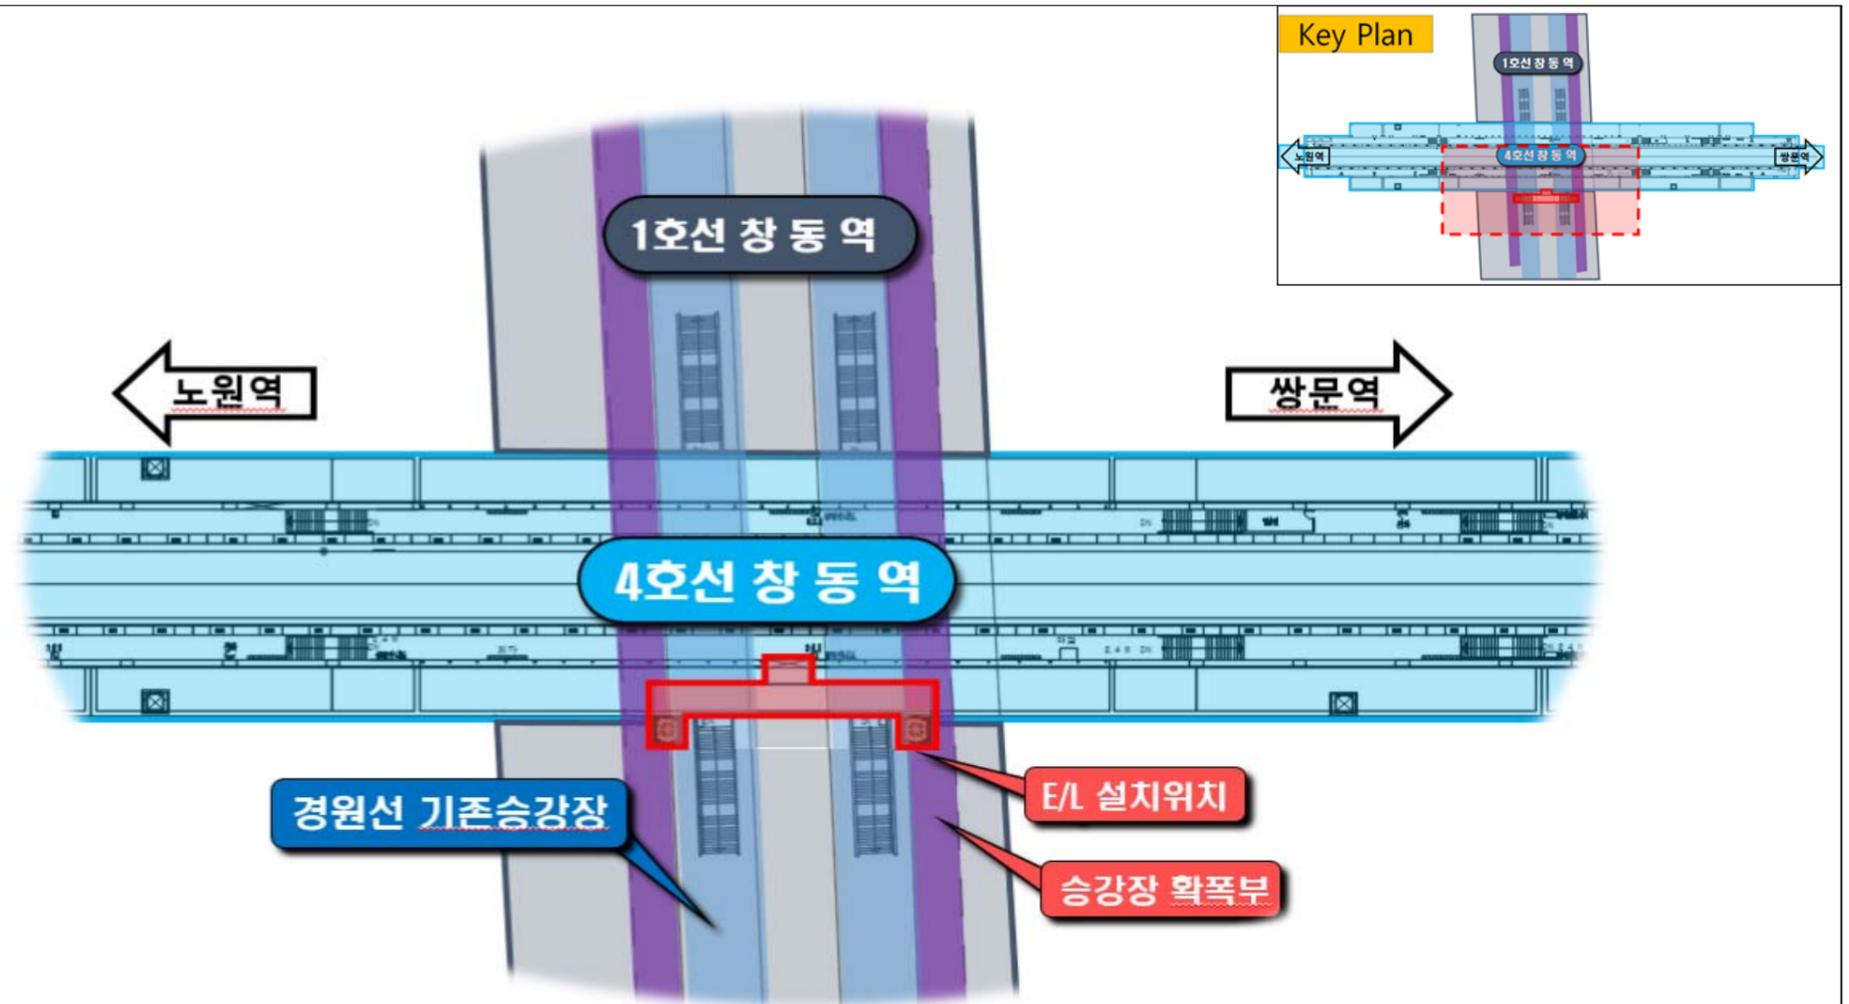

김 용 석 시 의 원
(더불어민주당, 도봉1)

『경원선, 4호선 창동역』

환승 엘리베이터 설치 추진현황

2020. 06.




서울교통공사
Seoul Metro

김 용 석 시 의 원
(더불어민주당, 도봉1)

『경원선, 4호선 창동역』

환승 엘리베이터 설치 추진현황

1 위치도

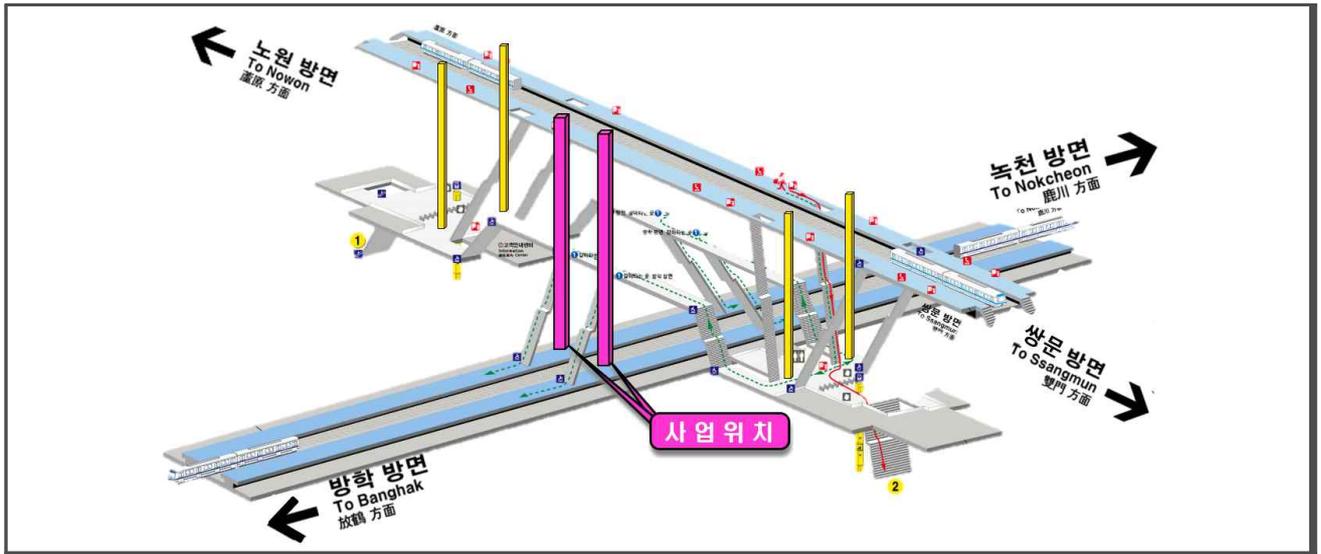

2 추진경과

- '17.07.12. : 창동역 환승E/L 설치를 위한 선로폐쇄 및 사업비분담 협의 (서울교통공사 ⇒ 한국철도공사, 한국철도시설공단)
- '17.08.07. : 시장님 현장방문(인재근 국회의원님, 김용석 시의원님 참석)
- '17.09.15. : 창동역 E/L 설치 관련 대책 회의

- 회의결과 : 경원선 고상홈 확장 후 환승 E/L 설치
 - 한국철도공사 : 경원선 고상홈 확장 (국토부 예산지원)
 - 서울교통공사 : 환승 E/L 2대 설치 【사업비 : 12억원(기확보)】
- '18.06.04. : 고상홈 확장 설계용역 완료 (철도공단)
- '18.11월 ~ '19.10월 : E/L 설치 설계용역 완료(우리 공사)
- '20년 05월 : 고상홈 확장 공사 발주(한국철도공사)
 - 공사명 : 경원선 창동역 승강장 개량 기타공사
 - 공사기간 : 착공일로부터 300일간('20년 06월 ~ '21년 04월 예상)
 - 공사금액 : 약 72억원(추정가)

3 문제점

- 환승역 E/L 공사 선행공종인 한국철도공사의 경원선 승강장 확장공사 지연으로 공정에 차질 발생
- 기 확보된 창동역 환승 E/L 매칭예산 사업이 '21년까지 종료됨에 따라, 경원선 승강장 공사 추가 지연시 공사기간 절대부족 등의 사유로 예산사용 불가사태 발생 우려

4 향후 계획

- 한국철도공사 승강장 확장공사가 종료되는 대로 E/L설치가 착공될 수 있도록 확장공사 종료시기에 맞춰 조기 발주 시행
- 2021년 말까지 환승역 E/L 공사 완료 추진
 - 세부 추진일정

구분	2020년								2021년												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
승강장 확장 (철도공사)	■								■												
E/L 설치 (교통공사)	발주									■											
	공사													■							
	개통																	■			
