



2026 주요업무 보고


2026. 6.

서울아리수본부

I

일반 현황

조 직 1 본부(5부 1과), 8 사업소, 7센터(정수 6, 자재1), 1 연구원

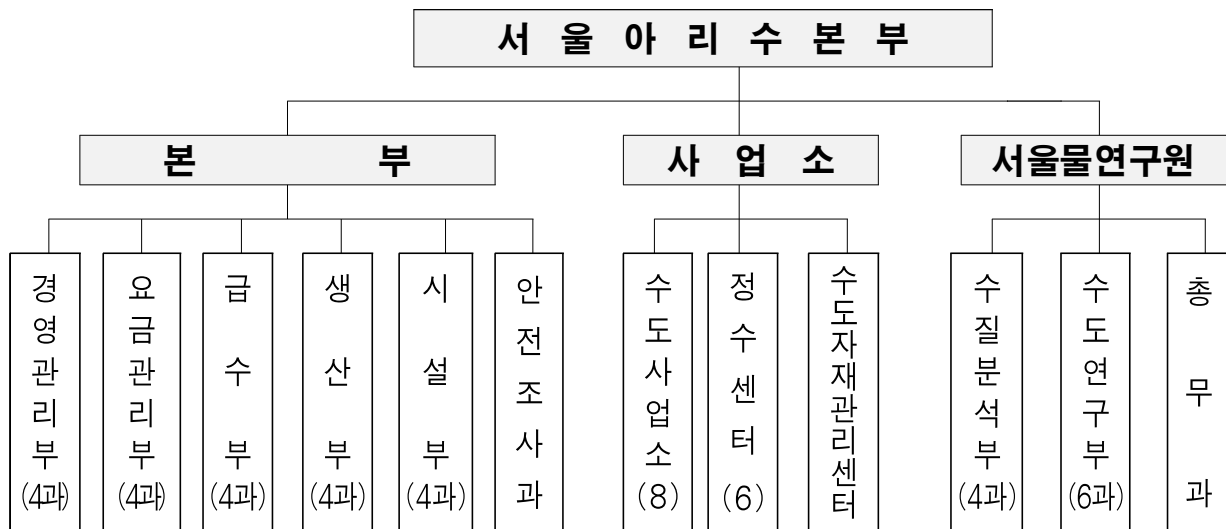

인 력 1,836 / 1,814명(정원/현원)

(’26.5.15.기준)

합 계	일 반 직	관리운영직	연구직	전문경력관	임기제
정원/현원	정원/현원	정원/현원	정원/현원	정원/현원	정원/현원
1,836/1,814	1,561/1,514	139/125	75/73	41/41	20/20 (시간선택제 41)


※ 기관별 현원 : 본부 227, 수도사업소 1,049, 정수센터 429, 연구원 78, 자재센터 31

주요 기능

구 분	담 당 업 무
본 부	경 영 관 리 부
	인사·조직, 업무계획 수립, 예산, 홍보, 민원, 교육, 대외협력
	요 금 관 리 부
	수도요금 조정·부과·징수 및 체납관리, 예산지출 및 재산관리
	급 수 부
	정수장·배수지·가압장 등 신설 계획, 배급수 운영·급수공사
사 업 소	생 산 부
	수돗물 생산관리, 정수센터 운영 지도·감독 및 기술진단
	시 설 부
	상수도 시설물 공사, 누수복구, 배수지가압장 유지관리, 정보화시스템 관리
사 업 소	안 전 조 사 과
	청렴, 공직기강, 중대재해·재난안전 실태 점검, 계약 심사
	수 도 사 업 소 (8)
	상·하수도 요금부과·징수 및 체납관리, 수도시설 유지관리
사 업 소	정 수 센 터 (6)
	아리수 생산·수질관리, 정수시설물 유지보수, 정수약품 관리
	수도자재 관리센터
서 울 물 연 구 원	상수도 공사용 자재수급계획, 기자재 구매·수급 재고관리
	서울물연구원
서 울 물 연 구 원	상수원·원수·정수 수질 조사·관리 및 오염물질 등 연구

2026년 예산


< 예산 규모 : 1조 1,000억 원 >

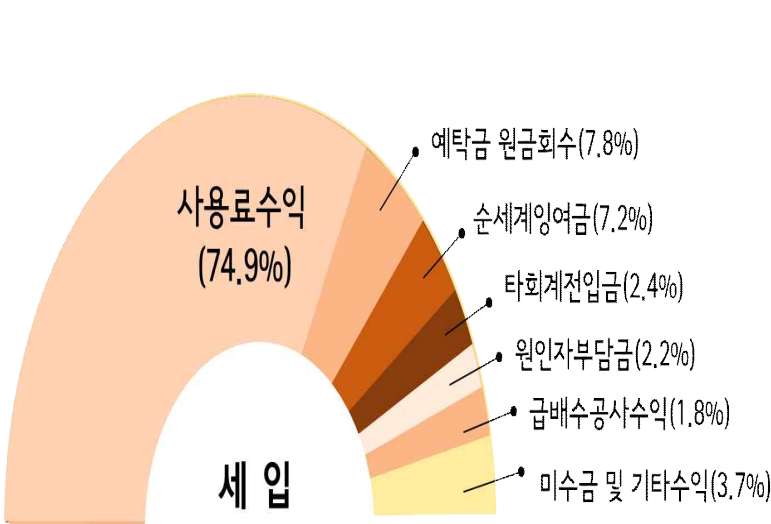

(단위 : 억 원, %)

구 분		예산액	비율
합 계		11,000	100
자체수입	사 용 료 수 익	8,235	74.9
	예탁금 원금회수	862	7.8
	순 세계 잉 여 금	791	7.2
	타 회 계 전 입 금	262	2.4
	원 인 자 부 담 금	242	2.2
	급 배 수 공 사 수 익	193	1.8
	미 수 금	192	1.7
	기 타 수 익	223	2.0
의존수입	국 고 보 조 금	0	0.0


※기타수익 : 자산매각수입, 불용품매각수입 등

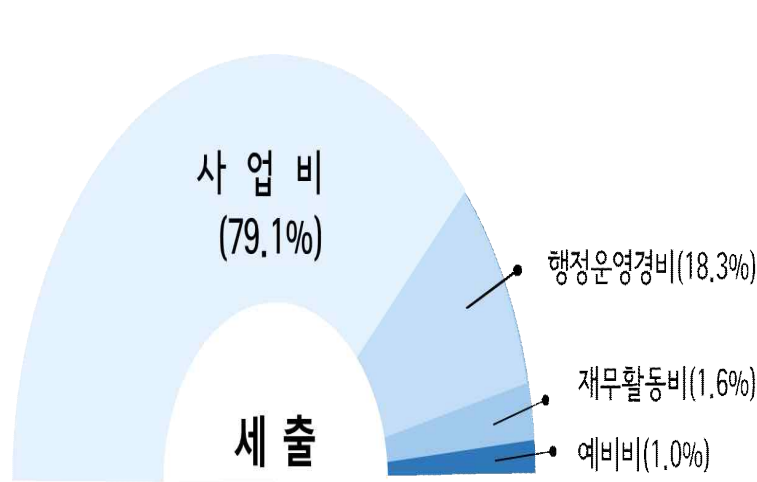

(단위 : 억 원, %)

구 분		예산액	비율
합 계		11,000	100
사 업 비		8,702	79.1
일반예산	행 정 운 영 경 비	2,012	18.3
	재 무 활 동 비	171	1.6
	예 비 비	115	1.0

분야별 사업비 (8,702억원)

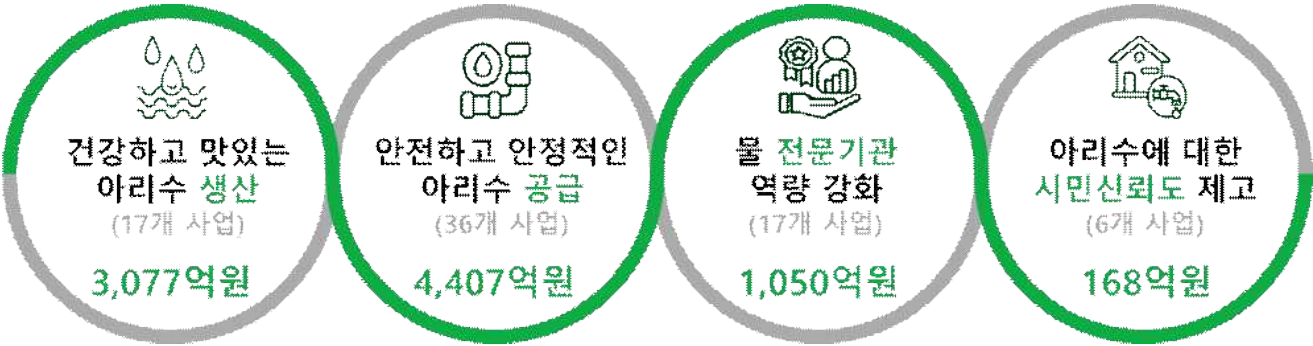

아리수 생산

[아리수 생산 공정]



○ 생산시설 : 6개 정수센터, 4개 취수장

- 생산능력 : 고도정수 380만 m^3 /일
- 생산량 : 평균 308만 m^3 /일, 최대 341만 m^3 /일 ('25.12.31.기준)

구 분	고도처리 준공년도	생산능력 (만 m^3 /일)	취수능력 (만 m^3 /일)
계	-	380	551
광 암	2012	25	팔 당
구 의	2015	45	강 북
뚝 도	2015	60	자 양 (80)
영등포	2010	45	풍 납 (70)
암 사	2014	110	암 사 (171)
강 북	2014	95	강 북 (230)




○ 원수구입 : 52,908백만원

- ① 팔당 원수비 : 233.7원/ m^3 (16,713백만원)
- ② 한강 원수비 : 52.7원/ m^3 (36,195백만원)

아리수 공급

[아리수 공급 흐름]



- (아리수 공급물길) 상수도관 : 13,283km
- (아리수 저 장 소) 배 수 지 : 102개소 (저장용량 2,267천 m³)
- (아리수 펌프시설) 가 압 장 : 222개소

아리수 현황

- 급수현황 (급수인구 : 9,579,177명)

(단위:명, '25.12월말 기준)

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
급수구역	종로, 용산 성북, 중구	은평, 마포 서대문구	광진, 성동 중랑, 동대문구	강북, 도봉 노원구	양천, 구로 강서구	동작, 영등포 관악, 금천구	서초 강남구	송파 강동구
급수인구	929,737	1,145,782	1,382,518	1,077,954	1,393,145	1,514,482	981,803	1,153,756

- 수도요금

('25년 결산 기준)

요금 단가			업종별 ㎡당 단가		
생산원가	판매단가	요금현실화율	가정용	일반용	육탕용
910.3원	769.7원	84.6%	580원	1,270원	500원

※ 물이용부담금 : 170원/㎡

- 급수전 및 급수수익 : 2,267천개 / 825,574백만원

(단위:개, 백만원 / '25.12월말 기준)

구 분	계	가정용	일반용	육탕용	市界 外 등
수 전 수	2,267,390 (100%)	1,952,249 (86.1%)	314,518 (13.8%)	623 (0.1%)	-
급수수익	825,574 (100%)	410,498 (49.7%)	388,217 (47.0%)	6,001 (0.8%)	20,858 (2.5%)

II

정책 방향

2026년 정책방향

비전

세계 최고 수준의 신뢰받는 서울 아리수

목표

철저한 안전관리와 수질 확보로 시민 체감성과 극대화

추진 전략

중점 추진과제

1

안전 관리
체계 확립

- 정수센터 책임감리 전면 도입으로 현장 안전망 강화
- 안전 레드카드제(안전수칙 위반자 현장퇴출) 강화
- 굴착기 스마트 안전존 도입
- 정수센터 중앙제어실 이중화 구축

2

깨끗한
수질 확보

- 365일 체계적이고 촘촘한 안심 수질관리
- 상수도관 주기적 세척으로 맑은 물길 조성
- 클린닥터서비스, 무료 수질검사로 깨끗한 아리수 공급
- 관말 정체수 자동배출 및 실시간 수질 공개

3

지속 가능한
인프라 확충

- 장기 사용 상수도관 정비로 지반침하 예방
- 아리수 생산시설 현대화 및 공급용량 확대
- 배수지 신·증설로 단수없는 급수환경 조성
- 블록시스템 구축으로 안정적 급수체계 마련

4

시민 곁에
다가가
는
행정서비스 구현

- 수도계량기 원격검침 전환, 구매업무 개선
- 서울 곳곳을 찾아가는 아리수 와우카, 동행음수대
- 다양한 요금서비스 확대로 시민편의 제고
- 친환경 병물아리수 지원으로 재난 시 시민생활 보호

2026년 성과목표

분 야	지 표 명	세 부 지 표	기 준	2025 실 적	2026 목 표
수 질	아 리 수 수질검사 항목	수 질 검 사	항 목 수	357 항목	362 항목
	상 수 도 관 세 척 길 이	세 척 연 장	세 척 길 이	대형 38km 소형 650km	대형 48km 소형 652km
	아 리 수 품 질 확 인 제	방 문 검 사	검 사 개 소	21만 건	22만 건
인프라	장 기 사 용 상수도관 정비	교 체 연 장	교 체 길 이	90.8 km	110.5 km
	정수장 증설 및 현 대 화	진 행 단 계	공 정 률	설계	공사 착공 (강북,광암)
	스 마 트 원 격 검 칩	검 칩 전 환	전 환 건 수 (누 적)	25만 개	40만 개
서비스	서 울 형 수돗물 먹는 비율	수 돗 물 먹 는 비 율	먹 는 비 율	75 %	78%
	아 리 수 와 우 카	와 우 카 운	운 영 건 수	100 회	100 회
	친 환 경 병 물 아 리 수	병 물 생 산	공 급 량	116 만병	100만 병

Ⅲ

2026년 주요사업

1

제도 개선을 통한 안전관리 체계 확립



1. 정수센터 책임감리 전면 도입으로 현장 안전망 강화
2. 안전 레드카드제 강화
3. 굴착기 스마트 안전존 도입
4. 정수센터 중앙제어실 이중화 구축

1-1. 정수센터 책임감리1) 전면 도입으로 현장 안전망 강화

생산부장:전 훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장: 장기덕 ☎ 1310 담당: 김일구 ☎ 1313

정수센터 공사현장에 책임감리를 전면 도입하여 공사 품질을 제고하고
안전관리 대응체계를 확립하여 무사고 안전 상수도 구축

□ 사업개요

- 사업목적 : 위험공종2) **안전관리 강화**를 위한 **책임감리 도입**
- 사업대상 : 소규모 공사 130건 (기계 52, 전기 42, 토목·건축 36)
- 사 업 비 : 5,500백만원
- 사업내용 : 책임감리에 의한 **품질·공정·안전 등 공사 전반 사업관리**

□ 추진현황

- 소규모 공사 130건, 40명 **전문기술인 책임감리원 배치 완료**
 - 감리용역 발주·계약 (3~4월), 감리용역 수행 (5월~)

(단위: 명)

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
배치인원	40	7	5	6	6	9	7
대상공사	130	10	9	9	30	44	28

- 책임감리 운영 및 관리 강화 방안 수립 추진
 - 공사 품질 제고와 안전 대응체계 확립을 위한 감리인력 점검 관리
 - (정기점검) 주 1회 시공 적정성 및 감리자 업무수행 실태 점검
 - (역량관리) 감리자 교육 실시 및 역량 미달 시 즉시 교체 조치

□ 향후계획

- 정수센터 별 소규모 공사에 대한 책임감리 시행 '26. 6 ~12월
- 본부 주관으로 책임감리 운영 실태 점검 (본부 → 정수센터) '26. 6월

1) 책임감리 : 건설사업 전반을 총괄하여 종합적으로 관리·감독하는 감리 형태

2) 위험공종 : 밀폐공간(밸브실, 정수지,약품 탱크), 고소작업(벽·천장·옥상), 화기작업(용접, 인화성물질) 등

1-2. 안전 레드카드제 강화

안전조사과장 : 조창연 ☎3146-1640 안전관리팀장 : 이준모 ☎1648 담당 : 김동구 ☎1644

안전수칙 미준수자 퇴출 '**레드카드**'와 우수 공사장 '**인센티브**' 제도를 병행하여 근로자의 안전의식을 고취하고 안심 일터 조성

☐ 추진배경

- 상수도 공사장은 대부분 **50억 미만 소규모** ※ '25년 공사 609건중 603건이 50억미만(99%)
- **적극적 현장 지도로 안전공백 해소 및 안전문화 정착 필요**
 - (전담 안전관리자 부재) 소규모 공사업체의 인력·예산 부족으로 안전관리 소홀
 - (작업근로자 잦은 교체) 일용직 근로자 비중이 높아 교육 미비, 안전의식 취약

☐ 추진현황

- 아리수 전 공사장 (총 224개) **안전 레드카드제 강화 시행** ('26. 4월)
 - (대상) 아리수 전 공사장 주요 안전조치 위반자(고소작업 안전장비 미착용 등)
 - (조치) **2스트라이크 아웃제** (1회 시정조치 및 퇴출예고, 2회 현장퇴출)
- ※ **인센티브 제공으로 자발적 참여유도** (안전 우수업체 스티커 배부, 서울시 건설상 후보 추천)
- 안전 레드카드 및 안전 홍보물 제작 배포 완료 ('26. 4월)
 - (제작배포) 전 사업소 대상 레드카드 466매, 안전 홍보물 1,400매, 우수업체 스티커 50매

레드카드(전면)	레드카드(후면)	안전 우수업체 스티커

- 안전 레드카드 도입 취지 등 사업소 순회 설명회 실시('26. 4월)
 - 8개 사업소, 총 124명 (공무원 35명, 감리 및 공단 감독 89명)

☐ 향후계획

- 기관장 특별 안전점검 강화 및 위반자 레드카드 발행 '26. 6 ~ 12월

1-3. 굴착기 스마트 안전존 도입

안전조사과장 : 조창연 ☎3146-1640 안전관리팀장 : 이준모 ☎1648 담당 : 김 동 구 ☎1644

굴착기 작업반경을 시각화(안전존)하여 위험구역 사전인지로 시민과 근로자의 접촉·협착 등 안전사고를 예방하고자 함

☐ 추진배경

- 상수도 공사 작업현장 대부분은 **소규모 주택가 이면도로 굴착공사로**,
작업 공간 협소, 굴착기·작업자·보행자 동선 중첩으로 안전사고 위험이 큼
- 굴착기 작업반경 **사각지대 존재**, 언제 **회전할지 예측 불가한 장비 특성 상**
주변 보행자와 근로자에게 **최소한의 안전 가이드라인 설치 필요**

☐ 추진현황

- 상수도 공사장 굴착기 안전존 도입 검토 ('26. 1월)
 - (현황) 실내작업 지게차에 도입 사례 있으나, 굴착기는 시인성이 낮아 적용 어려움
 - (검토) 도입목적, 활용방법, 기술적 사양 등을 설명하여 희망업체 자발적 개발유도
- **개발 제품 성능 테스트 및 보완** ('26. 2~5월, 3회)
 - (문 제 점) 낮 시간 야외 환경에서는 LED 램프의
광량 부족으로 가이드라인 식별 어려움
 - (개선조치) **LED 램프 광량을 증가시켜 선명도 및
시인성 대폭 개선**

※ 흐린날, 저녁 시간대에도 상시 사용가능 수준 확보
- 굴착기 안전존 시범 도입 운영 ('26. 5월, 10개소)
 - (대상) 긴급 누수복구공사, 천호동 일대 포장복구공사, 강북정수장 증설공사



☐ 향후계획

- 시범운영 및 성능검증 후 전 공사장 확대 적용 '26. 7월

1-4. 정수센터 중앙제어실 이중화 구축

생산부장 : 전 훈 ☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호 ☎1330 담당 : 김상진 ☎1332

국가정보자원관리원 화재사례 관련 정수센터(6개) 중앙제어실 이중화 구축으로 아리수 무중단 생산 운영 및 안전관리 강화

※ 대전 전산실 화재 ('25. 9. 26.)로 국가행정정보시스템 마비 (복구기간 약 3개월)

□ 사업개요

- 사업목적 : 정수센터 중앙제어실 이중화로 안전 강화
- 사업대상 : 6개 정수센터 (광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북)
- 사 업 비 : 3,900백만원
- 사업내용 : 기존 제어실과 다른 건물에 제어설비, CCTV 설비 이중화

<기 존>

- 동일 건물내 제어설비 이중화
- 기존 제어실 화재시 원격제어 불가
 - 생산공정 주요 데이터 백업 불가
 - CCTV 감시 및 영상저장 불가



<개 선>

- 별도 장소에 제어설비 이중화
- 기존 제어실 화재시에도 원격제어 가능
 - 생산공정 주요 데이터 백업 가능
 - CCTV 감시 및 영상저장 가능

□ 추진현황

- 실시설계 용역 시행 ('26. 1. ~ 5.)
 - 발주 및 계약 (1월), 건설기술 설계심의 및 용역 준공 (5월)
- 정수센터 별 이중화 구축 계획

설치위치	광 암	구의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
기존 제어실	본 관	본 관	여과지동	본 관	본 관	본 관
별도 제어실	여과지동	오존동	본관	2송수펌프동	1송수실	오존동

□ 향후계획

- 본 공사 시행 '26. 6 ~ 9월
 - 발주 및 계약 (6월), 설비제작 및 설치 (6~8월), 시운전 및 준공 (9월)

2

안심하고 음용할 수 있는 깨끗한 수질 확보



1. 365일 체계적이고 촘촘한 안심 수질관리
2. 상수도관 주기적 세척으로 맑은 물길 조성
3. 클린닥터서비스, 무료 수질검사로 깨끗한 아리수 공급
4. 관말 정체수 자동배출 및 실시간 수질 공개

2-1. 365일 체계적이고 촘촘한 안심 수질관리

생산부장 : 전 훈 ☎3146-1301 수질과장 : 이창하 ☎1320 담당 : 임태섭 ☎1321

상수원부터 취수 원수, 정수장까지 체계적이고 엄격한 수질관리로
365일 상시 안전하고 깨끗한 아리수 생산·공급

☐ 사업개요

- 빈틈없는 엄격한 수질관리로 고품질 아리수 생산·공급
- 소형생물(유충) 대응 고도처리 생산공정 최적 운영 및 관리 강화

☐ 추진현황

- 상수원 및 취수 원수 수질 모니터링으로 정수처리 선제적 대응
 - (검사항목) 상수원 16개 지점 31항목, 취수 원수 5개 지점(취수장) 340항목
- 정수장 수질검사 항목 확대 : '25년 357개 ⇒ '26년 362개 항목
 - (검사항목) 먹는물 기준(기후부) 60개 + 市 자체 감시항목 112개 + 미규제 신종물질 190개
 - (관리강화) 미규제 신종물질(과불화화합물) 5항목 추가로 선제적 수질감시 강화

< 원수 및 정수 수질검사 결과 >

- ◆ 원수 : BOD¹⁾ 평균 1.4mg/L로 수질 등급 '좋음(Ib)' 상태 유지
- ◆ 정수 : 먹는물 수질기준 및 자체 감시항목 모두 수질기준에 "적합"

○ 소형생물(유충) 대응 다중방어체계 확립 유지

- 365일 상시 모니터링, 고도정수처리(오존+입상활성탄) 강화로 유충 완벽 제거

< '26년 소형생물(유충) 발생 현황 >

- ◆ 취수 원수 모니터링 결과 : 일평균 2마리/톤 유입
- ◆ 정수·배수지 : 모두 "불검출" (정수처리 과정에서 모두 제거)



깔따구 유충

- 정수센터(6개소) 활성탄지 스트레이너(미세 필터 여과망) 160개소 설치완료

☐ 향후계획

- 원·정수 수질관리 강화 및 신속 대응체계 유지 '26. 6~12월

1) BOD(생물화학적산소요구량) : 물 속에 있는 유기물의 오염 정도를 나타내는 지표(수질등급 "좋음" 2.0 이하)


2-2 상수도관 주기적 세척으로 맑은 물길 조성

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 급수운영과장 : 강희권 ☎1460 담 당 : 안 윤 자 ☎1462

장기사용관 및 수계전환 등으로 혼탁수 발생 민원이 우려되는 지역에 선제적인 관세척을 통해 가정까지 안전하고 깨끗한 아리수 공급

☐ 사업개요

- 사업내용 : 상수도관 세척으로 침전된 물때(슬라임) 제거
- 사업대상 : 대형, 소형 상수도관 세척 700km
- 사 업 비 : 17,446백만원



☐ 추진현황

- 대형관, 침전물이 많은 소형관은 세척 **전문업체** 활용하여 꼼꼼한 시행
 - 공법선정위원회를 통한 세척공법 선정 후 용역 발주 및 업체 선정 (2~4월)
 - 점검구 설치 및 대·소형관 (80~1,000mm) 94km 중 10.3km 세척 (10.6%)
- 침전물이 적은 소형관은 세척 **유경험 전문인력** 활용하여 신속 추진
 - 전문인력 64명 채용, 유속유량측정장치를 활용하여 세척 시행 (3월)
 - 소형관 (80~350mm) 606km 중 208km 세척 (34.3%)

【 사업소별 추진 목표 / 실적 】

('26. 5. 15. 기준 / 단위 : km)

사 업 명		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	목표	700	90	86.5	87	88	87.5	87	88	86
	실적	218.3	27.0	26.7	25.7	29.5	28.3	25.1	29.4	26.6
전문업체 (대·소형관)	목표	94	14	10.5	11	12	11.5	11	13	11
	실적	10.3	1.0	1.7	0.7	1.5	1.3	1.1	1.4	1.6
전문인력 (소형관)	목표	606	76	76	76	76	76	76	75	75
	실적	208	26	25	25	28	27	24	28	25

☐ 향후계획

- 상수도관 세척 시행 '26. 6 ~ 11월
- 전문업체, 전문인력 세척 효과평가 '26. 7 ~ 12월

23 클린닥터서비스, 무료수질검사로 깨끗한 아리수공급

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 급수설비과장 : 이훈재 ☎1470 담당 : 김민서 ☎1473
생산부장 : 전 훈 ☎3146-1301 수 질 과 장 : 이창하 ☎1320 담당 : 김은영 ☎1324

세계 최고 수준의 깨끗하고 맛있는 아리수 공급을 위한 클린닥터서비스와 수도꼭지 무료 수질검사로 아리수 신뢰도 제고

① 녹물걱정 없는 클린닥터 서비스

□ 사업개요

- 사업내용 : 급수관 공사·세척·필터비 등 지원으로 노후주택 급수환경 개선
- 사업대상 : 급수관 교체비 지원 (5,711가구), 세척 및 필터비 지원 (1,368가구)
※ '94. 4. 1. 이전 아연도강관을 급수관으로 사용하는 주택
- 사업비 : 3,491백만원

구 분	옥내 급수관 공사비	옥내 급수관 세척비	필터비 지원
지원 내용	공사비 80% (다가구 최대 5,000천원, 공동주택 1,400천원)	세척비 80% (최대 180천원)	필터 구입비 (최대 90천원)
추진 실적	540,424가구 ('07~'25년)	4,473가구 ('23~'25년)	

※ '25년까지 옥내 급수관 교체 목표 총 56만 5천가구 중 96.4% 완료 ⇒ '26년은 97% 완료 예정

□ 추진현황

- 급수관 교체 : 목표 5,711가구 중 501가구 지원 (8.8%)
- 세척 및 필터 : 목표 1,368가구 중 375가구 지원 (27.4%)

('26. 5. 15. 기준 / 단위: 가구수)

구분		합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
급수관 교체	목표	5,711	200	280	250	742	1,530	380	187	2,142
	실적	501	46	74	59	24	70	104	48	76
	달성률(%)	8.8	23.0	26.4	23.6	3.2	4.6	27.4	25.7	3.5
세척 및 필터	목표	1,368	100	110	150	230	150	53	250	325
	실적	375	3	10	96	9	27	4	41	185
	달성률(%)	27.4	3.0	9.1	64	3.9	18	7.5	16.4	56.9

□ 향후계획

- 옥내 급수관 교체 지원 및 세척·필터 비용 지속 지원 '26. 6~ 12월

② 우리집 아리수 무료 수질검사


□ 사업개요

- 사업목표 : 대상별 맞춤형 수질검사 확대 ('25년 20만건 ⇒ '26년 22만건)
 - 취약시설 중점 관리, 야간·공휴일 및 비대면 등 맞춤형 수질검사 서비스 확대
- 사업내용 : 민간 수질검사원 160명 채용, 찾아가는 무료 수질검사
- 사 업 비 : 4,300백만원

□ 추진현황

- 1인가구, 맞벌이 등 생활여건을 반영한 야간·휴일 및 비대면 수질검사 추진
 - 야간·휴일 수질검사 전담반 편성 및 확대 운영 ('26. 3.~)
 - 누리집·120다산콜·땡겨요 홍보 배너를 통한 비대면 수질검사 서비스 시행 ('26. 5.~)

< 비대면 수질검사 진행 과정 >

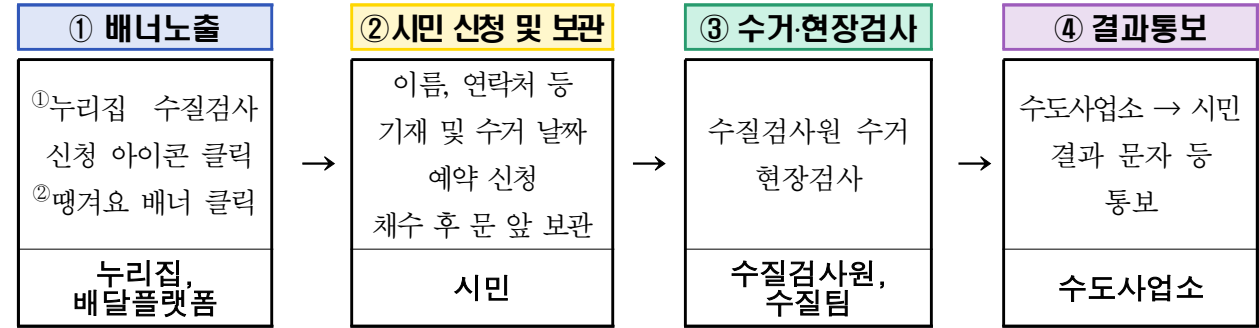

- 음수대(분기별 1회), 취약계층 이용시설 등 찾아가는 수질검사 지속 추진
 - 음수대 1분기 수질검사 완료 및 2분기 검사 추진 중
 - 취약계층 이용시설, 노후주택 등 찾아가는 수질검사 상시 추진
- 추진실적 : 총 64,660건 (29.4%)

('26. 5. 15. 기준 / 단위: 건)

구분	계	야간·공휴일·비대면	취약계층·노후주택	음수대 등
목표	220,000	12,000	73,000	135,000
실적	64,660	800	21,329	42,531

□ 향후계획

- 여름철 음수대(공원 등) 특별점검 실시 '26. 6 ~7월
- 야간·공휴일 및 비대면 서비스 홍보 강화 '26. 6~12월

2-4 관말 정체수 자동배출 및 실시간 수질 공개

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 급수운영과장 : 강희권 ☎1460 담당 : 강지선 ☎1461

관망 말단지역의 정체수 자동 배출로 수질 사각지대를 해소하고, 실시간 수질 감시망 구축 및 투명한 수질정보 공개로 아리수 신뢰도 제고

① 정체수 자동배출장치 설치 · 운영

□ 사업개요

- 사업내용 : 관망 말단지역 정체수 관리방법 개선으로 수질 사각지대 해소
 - 정체수 자동배출장치 설치로 실시간 수질 감시 및 기준 초과 시 자동 배출


현 행	개 선
· 주기 : 20 ~ 50일 · 방법 : 인력 배출 · 항목 : 탁도, 잔류염소	· 주기 : 실시간 · 방법 : 정체수 자동배출장치로 자동 배출 · 항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

- 사업대상 : 정체수 자동배출장치 20대
- 사 업 비 : 1,280백만원

□ 추진현황 ※ '24년~'26년 (3년간) : 60개소 (20개소/년)

- 상습 수질민원 발생 및 상수도관 말단 지점 등 20개소 선정
- 정체수 자동배출장치 선정 심의위원회 개최, 20대 구매계약 ('26. 4월)
 - 주로 '80~'00년대 설치된 80~200mm 관말 설치 (8개 수도사업소별 1~4개)

※ 원활한 사업추진을 위해 본부에서 일괄 설치 후 관할 수도사업소로 관리 전환

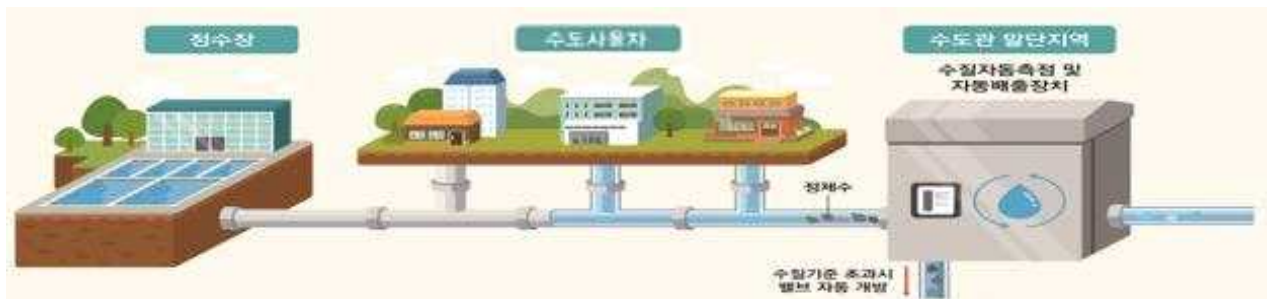

□ 향후계획

- 정체수 자동배출장치 설치 및 운영 '26. 11월

② 실시간 대시민 수질 공개


□ 사업개요

- 서울 전역 수질 감시 및 측정 결과 투명한 정보공개로 신뢰도 제고
- 실시간 모니터링, 수질 이상 시 메시지 전송으로 즉각 현장 대응 및 조치
 - (시스템) 수질측정 556지점 / 전송설비 135대, 운영소프트웨어 25식
- 사 업 비 : 2,931백만원



□ 추진현황

- 가정내 수도꼭지 수질 정보 100지점 최초 공개
 - 아파트·빌라·상가 등 매월 100지점 선정하여 익월 15일 공개
 - 누리집 ‘수도꼭지 수질’ 메뉴 신설 및 자치구별 그래픽 지도 기반 서비스 도입하여 시민 정보 접근 편의성 제고
- 수질사고 신속 대응을 위한 실시간 수질감시체계 구축
 - 수질 기준치 초과 시 경보음 발생, 운영자에게 SMS 자동발송 (본부, 수도사업소)



- 모바일 시스템 활용을 통해 현장 대응력 강화 및 수질사고 신속 대응
- 한눈에 보이는 우리 동네 수질 정보 제공으로 아리수 신뢰도 제고
 - 아리수맵에서 20분 단위로 수질측정값 대시민 공개 (탁도, 잔류염소, pH)
 - 생활 밀착형 정보 (음수대 위치, 단수안내 등) 제공으로 시민 불편사항 최소화
 - ※ 서울아리수본부 누리집 → 수질정보 → 우리동네 수질보기

□ 향후계획

- 수질자동측정기 및 시스템 유지관리 '26. 6~12월

3

지속가능한 생산 · 공급 시설 인프라 확충



1. 장기 사용 상수도관 정비로 지반침하 예방
2. 아리수 생산시설 현대화 및 공급용량 확대
3. 배수지 신·증설로 단수없는 급수환경 조성
4. 블록시스템 구축으로 안정적 급수체계 마련

3-1. 장기 사용 상수도관 정비로 지반침하 예방

시설부장 : 김형준 ☎3146-1501 누수대응과장 : 강은영 ☎1510 담당 : 정재윤 ☎1518

누수 취약, 수질사고 개연성이 높은 장기 사용 상수도관을 선제적으로 정비하여 지반침하 사고를 예방하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

- 사업내용 : 누수에 취약한 장기 사용 상수도관¹⁾ 집중 정비
- 정비대상 : 110.5km (배급수관 90.5km, 송배수관 18.9km, 광암수계 1.1km)
- 사업비 : 197,944백만원

□ 추진현황

- 수질 관리와 지하 안전을 고려한 누수 취약관로 선정, 집중 정비
 - (대상) 지반침하 사고에 대한 불안감 해소를 위해 안전 확보구역 우선 선정
 - (물량) 신속한 선제적 정비를 위해 '25년 (90.8km)보다 22% 확대 (119.7km↑)
- '26년 정비목표 110.5km 중 11.5km 정비 (10.4%)

【사업소별 추진실적】

('26. 5. 15. 기준)

구 분		계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비 목표 (km)	계	110.5	3.4	17.6	11	15.5	10.8	13	14.5	12.3	12.4
	D350mm 이하	90.5	-	14.6	10.0	12.6	8.5	11.7	12.5	10.0	10.6
	D400mm 이상	18.9	2.3	3.0	1.0	2.9	2.3	1.3	2.0	2.3	1.8
	광 암 수 계	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
정비 실적 (km)	계	11.5	3.0	0.4	1.8	1.4	0.3	1.5	1.1	0.7	1.3
	D350mm 이하	8.2	-	0.4	1.7	1.4	0.3	1.5	1.1	0.6	1.2
	D400mm 이상	3.2	2.9	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	광 암 수 계	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
정비 율 (%)		10.4	87.4	2.4	16.4	8.7	3.1	11.7	7.4	6.2	9.8

※ (1월~4월) 설계도서 작성, 공사 발주 및 착공, (5월 이후) 본격적인 공사 시행

□ 향후계획

- 공사시행 및 준공 '26. 6 ~ 12월

1) 장기 사용 상수도관 : 매설 후 30년 이상 경과하여 혼탁수 및 누수 발생 우려가 높은 상수도관

3-2 아리수 생산시설 현대화 및 공급용량 확대

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 계획설계과장 : 김지환 ☎1410 담당 : 김영규 ☎1413
 시설부장 : 김형준 ☎3146-1501 시설건설과장 : 임홍필 ☎1490 담당 : 제영도 ☎1492

대부분의 정수장이 40년을 경과하여 안정적인 수돗물 생산체계 구축을 위해 정수장 순환 정비 추진 ※ 광암 47년, 구의1 42년, 암사1 40년, 영등포1 34년

☐ 사업개요

- 40년 이상 사용 노후 정수장 순차적 현대화
 - 광암 (40만 m³/일), 암사1 (130만→120만 m³/일)
- 노후 정수장 정비 대체용량 확보 ('25년 최대 90.9% 가동)
 - 광암 (10만 m³/일), 강북2 (25만 m³/일) 증설



<정수장 경과연수 현황>

☐ 추진내용 (사업비 총 17,564억원)

- 강북2 정수장 증설 ('26. 3월 본공사 착공, '29년 준공, 총 사업비 2,761억원)
 - 암사1정수장 현대화 중 급수지원, 가뭄 등 기후변화 대응 생산능력 확충
- 광암정수장 고도증설 및 현대화 ('26. 6월 착공, '30년 준공, 총 사업비 3,316억원)
 - 공급지역 (3기 신도시) 확대, 노후 시설 ('79년 준공) 현대화
- 암사1정수장 현대화 ('26년 기본계획 수립, '32년 착공, '43년 준공, 총 사업비 9,800억원)
 - 강북2 및 광암정수장 증설완료 시기에 맞춰 노후시설 ('86년 준공) 현대화
- 강북~암사 송수계통 연결 ('26. 9월 착공, '30년 준공, 총 사업비 842억원)
 - 암사정수장 현대화 중 생산량 감소에 대비한 급수지원 및 비상 공급망 구축
- 강북~영등포 비상관로 연결 ('26년 설계, '27년 착공, '31년 준공, 총 사업비 845억원)
 - 서남권 일대 급수체계 안정화를 위한 비상관로 연결

☐ 향후계획

- (강북) 우선 시공분 준공 및 본공사 시행 '26. 6 ~ 12월
- (광암) 시설공사(1차수) 착공 및 시행 '26. 6 ~ 12월
- (암사) 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공 '26. 7월
- (강북~암사) 건설사업관리용역 및 시설공사 착공 '26. 9월
- (강북~영등포) 기본 및 실시설계 용역 준공 '26. 8월


참고자료 노후 정수장 현대화 및 증설계획

연차별 추진계획

- ◆ **[현대화]** 6개 정수센터, 9개 정수장 중 4개는 평균 40년 이상 노후 정수장
 - 광암 47년, 구의1 42년, 암사1 40년, 영등포1 34년 경과 ('26년 기준: 평균 40.7년)




- ◆ **[증 설]** 가동률이 높아 정수장 사고·순환정비 시 대체 용량 부족
 - '25년 정수장 최대 가동률 90.9% (상수도설계기준 75% 내외 권장)



- ◆ **[송수계통, 비상관로 연결]** 안정적 급수지원 및 비상 공급망 구축
 - 강북-암사 송수계통 연결 : D 1,650 ~ 2,200mm, L=1.1km ('22~'30년)
 - 강북-영등포 비상관로 연결 : D 1,350 ~ 1,650mm, L=2.4km ('24~'31년)

정수장별 현대화/증설

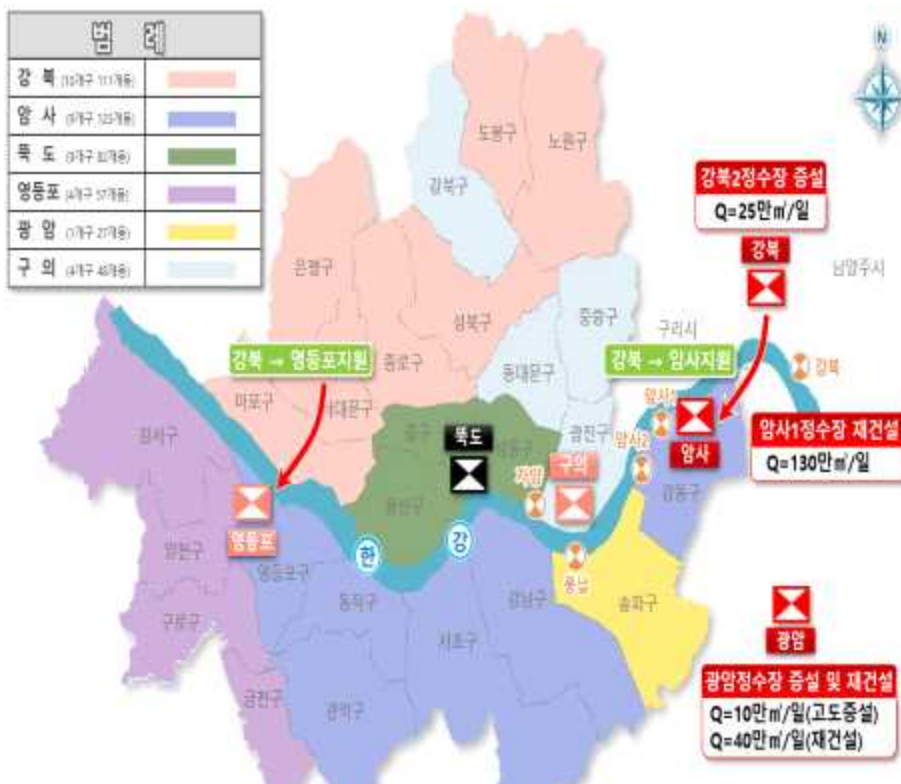

구 분	구 모 (만㎥/일)	사업비 (억원)
증 설	강 북 2 (25 25) (고도 고도)	2,761
	광 암 10 (고도 고도)	786
현 대 화	40	2,530
	암 사 1 130→120	9,800
	구 의 1 25	919
	영등포1 30	1,026
관 로	강북암사 송수계통 1.1km	842
	강북영등포 비상관로 2.4km	845

3-3 배수지 신·증설로 단수없는 급수환경 조성

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 계획설계과장 : 김지환 ☎ 1410 담당 : 하주연 ☎1416
시설부장 : 김형준 ☎3146-1501 시설건설과장 : 임홍필 ☎ 1490 담당 : 김용길 조재근 ☎1556

대규모 가압급수구역과 배수지 시설용량이 부족한 지역에 배수지 신·증설을 추진하여 서울 전역 안정적인 급수체계 구축

☐ 사업개요

- 사업내용 : 배수지 **신설 3개소** (1.9만㎡), **증설 2개소** (1.25만㎡)
 - 기존 가압식 급수방식을 정전·사고시에도 급수 가능한 자연유하 방식으로 전환
 - 배수지 증설로 체류시간(12hr) 미충족 배수지 저장용량 증대

☐ 추진현황 (사업비 총 1,210억원)

- **안정적 급수 기반 확보**를 위한 **배수지 신설** (총 사업비 851억원)
 - **미아** 배수지(강북구) **신설** (5천㎡, '25.9월~'27.7월, 사업비 241억원)
 - 배수지 토공작업 및 가시설(흙막이) 설치, 송수관로 부설 (D400mm, L=1.0km 중 0.2km 설치)
 - **까치산** 배수지(동작구) **신설** (5천㎡, '25.8월~'28.4월, 사업비 189억원)
 - 배수지 토공작업 및 가시설(흙막이) 설치, 송수관로 부설 (D500mm, L= 2.9km 중 1.0km 설치)
 - **매봉재** 배수지(서초구) **신설** (9천㎡, '26년 설계, '31년 준공, 사업비 421억원)
 - 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ('26. 5)
- **비상시 무단수 급수체계 구축**을 위한 **배수지 증설** (총 사업비 359억원)
 - **봉현** 배수지(동작·관악구) **증설** (6천㎡, '26년 설계, '30년 준공, 사업비 111억원)
 - 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ('25. 6.), 도시계획시설결정 추진('26. 9.)
 - **거마** 배수지(하남시) **증설** (6.5천㎡, '26년 설계, '31년 준공, 사업비 248억원)
 - 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ('26. 5)

☐ 향후계획

- (미아·까치산 배수지 신설) 공사 추진 '25. 8 ~ '28. 4월
- (매봉재·거마 배수지 신·증설) 실시설계 용역 '26. 6 ~ '27. 11월
- (봉현 배수지 증설) 실시설계 용역 준공 '26. 12월

3-4 블록시스템 구축으로 안정적 급수체계 마련

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 배수과장 : 양윤선 ☎1430 담당 : 안효민 ☎1432

상수도 관망을 블록(구역)으로 구분 관리하여 수돗물 공급의 효율성 및 안정성을 향상시키고 누수 등 사고 발생 시 대응능력 제고

☐ 사업개요

- 상수도 관망의 효율적 운영 관리를 위한 공급 체계 구축
- 재해·재난 등에 신속하게 대응하고 상수도관 사고로 인한 피해 최소화

☐ 추진현황 (사업비 총 224억원)

- 주요 관로 이중화, 비상시 무단수 급수체계 구축 (중블록 3개 5.1km)
 - 공사 총 11건 중 착공 7건, 계약체결 절차 진행 4건으로 **정상 추진 중**
 - (착 공) 구경(D)=300~800mm, 연장(L)=2.0km (7건, 추진 공정률 약 20%)
 - (계약진행) 구경(D)=300~800mm, 연장(L)=3.1km (4건, 입찰 공고 중)
- 블록 내 유수율 관리를 위한 **유량계**(유입·유출 측정) **10개소 추가 설치**
 - 유량계 설치를 위한 시험굴착 및 전기·통신 시설 설치 가능 여부 검토 중

※ 연차별 투자현황 및 구축 계획 ('18~'40년, 중블록 105개 → **151개소**)

- 블록시스템 현황 (2,198개) : 대블록 32개, 중블록 127개, 소블록 2,039개

구 분	총 계	기투자 ('18~'25)	투자 계획				
			소계	2026	2027	2028	'29~'40
사 업 비 (억 원)	2,664	1,259	1,405	224	261	261	659
중블록 재구축, 대체관로 신설(km)	170.6	49.8	120.8	5.1	17.7	17.8	80.2
중블록 구축 (개소)	151	127	24	3	3	3	15

☐ 향후계획

- 공사 시행 및 준공 '26. 6 ~ 12월

4

시민 곁에 다가가는 행정서비스 구현



1. 수도계량기 원격검침 전환, 구매업무 개선
2. 서울 곳곳을 찾아가는 아리수 와우카, 동행 음수대
3. 다양한 요금서비스 확대로 시민 편익 제고
4. 친환경 병물아리수 지원으로 재난 시 시민생활 보호

4-1. 수도계량기 원격검침 전환, 구매업무 개선

요금관리부장 : 문병기 ☎3146-1601 계측관리과장 : 정종영 ☎1250 담당 : 박지현, 윤효한 ☎1252, 1253

동파취약지역 우선 스마트 원격검침 전환, 수도계량기 입찰 평가방법 개선을 추진하여 시민불편 감소 및 계량기 입찰 투명성 향상

① 스마트 원격검침 전환 및 설치업무 일원화

☐ 사업개요

- 최근 5년간 동파이력이 있는 복도식 아파트에 동파 예방 효과가 높은 디지털계량기로 우선 교체하여 **시민불편**(단수, 안전사고 등) **선제적 예방**
- 디지털계량기(서울시설공단)와 통신단말기(아리수본부)의 **설치 주체가 상이하여 시민불편**(2회방문) 및 **안전사고 위험 감소**를 위해 설치 업무 일원화 추진

☐ 추진현황 (사업비 총 22,054백만원)

- 동파 취약지역(복도식 아파트) 스마트 원격검침 전환 추진('26. 3~11)
 - (인력) 서울시설공단 교체원 및 기간제노동자(60명)를 투입, 디지털계량기 설치
 - (교육) 기간제노동자의 현장 전문성 강화 교육(설치실습, 안전관리 등) 실시(4월)
 - (실적) 원격검침 전환 목표수량 150,458개 중 35,903개 교체완료(23.8%)
 - ※ 복도식 아파트가 '25/'26년 겨울철 동파 발생률 49.1% 차지

【 사업소별 추진 목표 / 실적 】

('26. 5.15. 기준 / 단위 : 개)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	150,458	2,254	9,099	14,530	53,149	36,195	9,813	15,009	10,409
실적	35,903	4,117	353	1,662	13,579	7,052	3,218	968	4,954

- 디지털계량기와 통신단말기 구매 및 설치 업무 **일원화**
 - (구매) 계량기(자재센터), 단말기(사업소) **구매 업무**를 자재관리센터로 **일원화**(3월)
 - (설치) **계량기 교체원**(시설공단, 기간제노동자) **단말기 설치 교육**으로 교체역량 확보(1월, 4월)
 - ※ 계량기 및 단말기 동시 설치로 연간 약 20억원 인건비 절감 예상

☐ 향후계획

- 스마트 원격검침 전환 추진 및 관리 '26. 5 ~ 12월

② 수도계량기 구매 입찰 평가방법 개선

□ 추진배경

- 계량기 구매 시 실질적 동일 업체로 의심되는 여러 업체가 동시에 입찰에 참가할 경우 입찰 공정성 훼손 우려
- 하자율과 고장률이 높고 기술력이 낮은 업체의 입찰 참여 배제와 납품 계량기 품질개선의 필요성 제기

['26년 수도계량기 구매 계획] (단위: 개, 백만원)

구 분	합 계	소형(50mm 이하)			대형(80mm 이상)
		기계식	디지털	일체형	디지털
구매수량	301,081	211,336	85,687	2,000	2,058
소요예산	15,634	8,021	4,851	290	2,472

※ 비축물량, 교체상황 등을 고려, 예산 범위 내에서 종류별 구매수량 조정 가능

□ 추진현황

- 수도계량기 구매업무 개선 및 납품검사 강화
 - 실질적 동일 업체로 확인된 입찰 참여 업체에 구매평가 감점 (-2점)
 - 하자율 높은 업체의 낙찰 방지를 위한 하자율 배점 상향 (5→7.5점)
 - 디지털 계량기의 납품검사 강화로 (습열시험 도입) 품질개선 유도

※ 외부 계량기 승인·인증 전문기관 (KTC 등)에 습열시험 의뢰 검토 및 협의 중

▶▶▶ 계량기 구매업무 개선 결과 “실질적 동일업체로 의심되는 동시 입찰 사례는 없었음”

[계량기 입찰업체 현황]

구매(1차)	업체수	입찰 업체명			
기계식 계량기	4	대한계전(낙찰)	삼성계기공업	연호미터넥	아이원테크
디지털 계량기	3	삼성계기공업(낙찰)	대한계전	아이원테크	

□ 향후계획

- 수도계량기 구매 시행 (자재센터) '26. 6 ~ 11월
- 수도계량기 납품검사 시 습열시험 추가 '26. 하반기

42 서울 곳곳을 찾아가는 아리수 와우카, 동행 음수대

경영관리부장 : 박진용 ☎3146-1101 홍보민원과장 : 김 홍 ☎1210 담당 : 이은주, 강수정 ☎1215
급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 급수설비과장 : 이훈재 ☎1470 담당 : 홍민표 ☎1417

서울 곳곳에 아리수를 먹고 즐기며 체험할 수 있는 아리수 와우카와 동행 음수대를 통한 아리수 먹는 문화 확산

① 서울 곳곳을 찾아가는 아리수 와우카

□ 사업개요

- 사업내용 : 市·자치구 및 학교 행사 연계 와우카(WOW) 100회 운영
- 사업목표 : 아리수 먹는 문화 확산
- 사업비 : 450백만원



아리수 WOW카 행사 현장

□ 추진현황 ('26. 5.15.기준)

- 운영실적 : 2회 ※ 정원박람회 (5월, 서울숲), 서울스프링페스티벌 (5월, 여의도 물빛광장)
- 수요조사 : 신청 안내 → 신청서 제출 → 대상 선정 및 결과 안내 ('26.3~4월)
 - (선 정) 市 24회, 자치구 20회, 학교 40회 ※ 잔여 회차 추가 수요조사 예정
 - (선정기준) ① 시민 참여 행사(500명 이상) ※ 학교 : 학생·교사·학부모 참여
 - ② 아리수 캠페인과 연계 가능한 건강, 운동, 환경친화적 행사
- 운영내용 : '건강한 아리수' 먹는 문화 확산 홍보
 - (체 험) 건강한 아리수, 아리수로 만든 건강차 (헛개차, 옥수수차) · 저당음료 시음
 - (서 비 스) 무료 수질검사 현장 접수, 수질검사 시연, 아리수 맵 활용 수질 안내
 - (캠 페 인) 카카오톡 아리수 채널 친구추가, 아리수 캠페인·이벤트 등 정보공유

□ 향후계획 ※ 6월 선거 이후 본격 운영 예정

추진목표	1분기	2분기	3분기	4분기
100회	계약 발주	25회	45회	30회

② 음수대 유지관리 및 찾아가는 동행 음수대

☐ 사업개요

- 사업목표 : 학교 등 아리수 음수대 설치, 축제 현장에 동행 음수대를 설치하여 누구나 이용이 편리한 아리수 음용환경 제공
- 사업내용 : 음수대 설치 및 유지관리, 찾아가는 동행 음수대(8대) 지원
- 사업비 : 4,193백만원 (이동식 동행음수대 36백만원)



☐ 추진현황

- 학교, 공공기관 등 음수대 설치 및 정기적 유지관리
 - 음수대 총 24,466대 중 내용연수(6년) 경과, 고장음수대 교체 및 신설(750대)
 - 정기적 유지관리(7회/년), 수질검사(4회/년)로 안전하게 마실 수 있는 음용환경 조성
- 대규모 시·구 축제(2일 이상 개최, 참여인원 1만명 이상)에 동행 음수대 지원
 - 해치, 슬로건 및 서울색 등 활용 시민친화적 홍보로 아리수 신뢰도 제고
 - 국제정원박람회, 봄꽃축제, 가을축제 등 서울시, 자치구 주요 축제·행사 지원
- 추진실적

(’26. 5.15.기준)

추진사업	추진실적		사업내용
	목표	실적	
아리수 음수대 설치	750대	55대	교육기관, 관공서 등 음수대 설치
아리수 음수대 유지관리	7회	3회	교육기관 음수대 정기점검(7회/년)
찾아가는 동행 음수대	8대(이상)	3대	’26년 서울숲 국제정원박람회

☐ 향후계획

- 학교 및 공공기관 아리수 음수대 설치 ’26. 6 ~ 11월
- 아리수 음수대 유지관리 추진 ’26. 6 ~ 12월
- 찾아가는 동행 음수대 행사·축제 지원 ’26. 7 ~ 11월

4-3. 다양한 요금 서비스 확대로 시민 편의 제고

요금관리부장 : 문병기 ☎3146-1601 요금제도과장 : 공미순 ☎1180 담당 : 김미정 ☎1181
계측관리과장 : 정종영 ☎1250 담당 : 김수진 ☎1257

디지털 기반의 수도 행정서비스를 적극 발굴·제공하여 시민 편의 제고
및 시민 만족도 향상 도모

☐ 사업개요

- '26년 수도요금 전자고지 가입률 목표 27% 달성
- 스마트 원격검침 데이터 활용 옥내누수 사전예방 강화

☐ 추진현황

- 맞춤형 홍보로 전자고지 가입률 상승 ['25년 46만가구 → '26년 5월 47만가구]
 - 공공기관·학교 대상 집중 홍보 및 가입 독려 ('25년 39.7% → '26. 5월 43.3%)
 - 전자고지 등 아리수 행정서비스 가입 혜택 안내문 제작·배포 (165만부, 5~6월)
 - ※ 자동납부·전자고지 모두 가입 최초 할인 3,000원, 납기별 200~1,000원 감면 혜택
 - 서울시 관내 신한은행 ATM기 영상 표출 및 홍보 리플릿 배포 (2,191개소, 4~5월)
- 스마트 검침 데이터 활용, 물사용량 패턴 분석으로 누수 조기 알림
 - (대상) 7일 물사용량 중 3일 연속 '물사용량 0'이 측정되지 않는 사용자
 - (방법) 스마트검침 사용자에게 누수량, 누수기간 등 문자·유선·우편 제공
 - (실적) 누수바로알리미 가입건수 : '25년 25만 (11%) → '26년 5월 26만 (12%)

☐ 향후계획

- 수도 조례 시행규칙 개정 추진 '26. 6~10월
 - 전자고지·자동납부 첫 감면 혜택 기간 연장 ('26년 12월 종료 → '29년 12월 까지 연장)
- 누수확인 안내 문자 자동알림 발송시스템 도입 '26. 10월



편리한 아리수 행정서비스 지금 바로 신청하고 혜택 받으세요!

1

빠르고 편리한 전자고지

기존의 수도요금 청구서 대신 문자, 카카오톡, 이메일, 모바일 앱으로 고지받는 서비스

- 전자고지 가입하면 납기마다 상수도 요금의 1%(200원~1,000원)할인
- 전자고지와 자동납부를 모두 신청하면 3,000원 첫감면(1회 한정)

2

우리집 아리수, 무료 수질검사(아리수품질확인제)

찾아가는 무료 수질검사 서비스(야간·공휴일 가능)

- 사전 방문 시간 협의 후 탁도 등 수질검사 시행
- ※ 비대면 수질검사서비스 시행 예정('26년 5월 중)

3

녹물 걱정 없는 클린닥터서비스

아연도강관이 사용된 '94년 4월 이전 건축된 노후주택 대상 수도관 개선 비용 지원

- 수도관 교체(경쟁) 공사비 지원 (단독주택 최대 150만 원, 다가구주택 최대 500만 원, 공동주택 세대급수관 최대 80만 원, 공동주택 공용급수관 최대 60만 원)
- 수도관 세척(최대 18만 원) 또는 수도꼭지(싱크대) 필터 설치 비용(최대 9만 원) 지원

4

숨은 누수 찾아주는 옥내누수 문자알림서비스

스마트 원격검침 세대를 대상으로 옥내누수 발생 시 문자, 카카오톡으로 안내하는 서비스

※ 대상자는 수도요금 청구서에 '스마트 원격검침 사용자'라고 표기되어 있어요



신청방법은?

관할 수도사업소 또는 120 다산콜센터 전화

〈관할 수도사업소 전화번호〉



중부수도사업소 (영등포구, 동작구, 용산구, 영등포구)	02-3146-2000	북부수도사업소 (노원구, 강북구, 도봉구)	02-3146-3200	강남수도사업소 (강서구, 강남구)	02-3146-4700
서부수도사업소 (은평구, 서대문구, 마포구)	02-3146-3500	강서수도사업소 (영등포구, 강서구, 구로구)	02-3146-3800	강동수도사업소 (송파구, 강동구)	02-3146-5000
동부수도사업소 (영등포구, 관악구, 양천구, 동작구)	02-3146-2600	남부수도사업소 (관악구, 동작구, 영등포구, 금천구)	02-3146-4400		

4-4. 친환경 병물아리수 지원으로 재난 시 시민생활 보호

생산부장 : 전 훈 ☎ 3146-1301 생산관리과장 : 장기덕 ☎ 1310 담당 : 구진희 ☎ 1312

재난·단수 발생 시 병물아리수 긴급 지원을 통한 시민 안전 확보 및
100% 재생원료 용기 사용으로 친환경 정책 실현

☐ 사업개요

○ 사업내용

- 재난·단수 및 폭염기간 병물 지원, 민방위 대피시설 비상음용수 지원
- 상시 비축량 20만병 확보 (영등포정수센터 : 15만병, 8개 수도사업소 : 5만병)

○ 지원계획 : 100만병 (350ml 80만병, 2L 20만병) ※ '25년 116만병 지원

○ 사업비 : 589백만원

☐ 추진현황

○ 재난 (폭염) 및 단수 지역, 민방위대피소 병물아리수 지원

- 자치구 민방위대피소에 비상음용수 지원으로 시민 안전확보 (11만병)
- 폭염대책기간 취약계층 (쪽방상당소, 노숙인시설) 지원 (1만병)

○ 장기보관에 따른 수질 안전성 실험 및 알루미늄 캔 용기 시범 생산

- 장기보관 수질안전 확인 ⇒ 30개월 보관 실험 ('24.6.~'26.11.)
- 알루미늄 캔 200개 시범 생산 후 수질 변화와 미세플라스틱 검사('26.1.~'27.1.)

○ 100% 재생 PET 용기 활용으로 친환경 병물 아리수 공급

- '24년부터 재생 100% 용기 지속 도입 중

☐ 향후계획

○ 폭염대책 기간 취약계층 병물아리수 지원 '26. 6 ~ 9월

○ 재난 및 단수 발생 대비 상시 비축물량 관리 '26. 연중

IV

현 안 업 무

1

2026 여름철 아리수 종합대책

여름철 집중호우와 폭염 등 각종 재난 및 사고를 선제적으로 예방하고 안정적인 급수체계를 유지하기 위한 아리수 종합대책 추진

□ 추진기간 : '26. 5. 15.(금) ~ 10. 15.(목) <5개월간>

□ 추진방향

- 폭염, 풍수해 시에도 깨끗한 아리수 공급을 위한 수질관리 강화
- 풍수해, 폭염, 태풍 등 긴급 재난 상황 발생 시 비상급수 지원
- 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 및 근로자 안전점검 추진

《 2026년 여름철 기후전망 》

기 온


평년(23.4~24℃)보다 기온이 높을 확률이 60%, 6월에는 이동성 고기압, 7~8월에는 북태평양 고기압 영향으로 예년보다 무더운 날씨가 예상됨

강수량


평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%이고, 여름철 동안 발달한 저기압과 대기 불안정의 영향으로 많은 비가 예상됨

< 여름철 평균기온 및 강수량 추이(1991~2025년) >

○ 평균기온(℃)

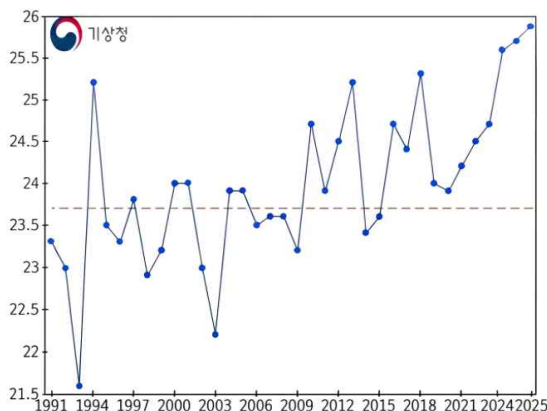

○ 강수량(mm)

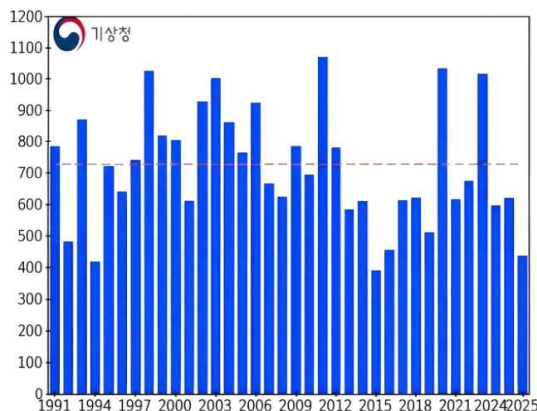

평균기온 : —

평년 : ---

강수량 : —

중양값 : ---

① 여름철 아리수 수질관리 강화

□ 사업개요

- 여름철 수온 상승 대비 **조류 및 맛·냄새물질 경보제 운영**
- 위생적이고 안정적인 아리수 공급을 위한 **모니터링 및 정수처리 강화**

□ 추진내용

- 장마, 집중 호우 시 **오염물질 다량 유입 대비 신속 대응체계 구축**
 - 원수 수질변화 집중 감시, 현장순찰 강화 등으로 자체 수질관리 목표 준수

항 목	수질기준	정수 수질관리 목표		수도꼭지 (건강한 물 가이드라인)
		평상 시	집중호우 시	
탁도(NTU)	0.5 이하	0.06 이하	0.1 이하	0.3 이하

- **‘조류경보제(한강본류)’** 및 **‘맛·냄새물질 경보제(한강본류, 취수장)’** 운영
 - 경보발령 : 유해남조류 1,000세포/mL, 2-MIB 20ng/L, 지오스민 100ng/L 이상 시

————— < 수질 변화 시 대응 체계 > —————

 **조류 및 맛·냄새물질 경보발령 시 수질분석 강화**

- ▶ 한강본류 : (평상시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회
- ▶ 취수원수 : (평상시) 주 1회 → (관심단계) 일 1회 → (경계단계) 일 2회

 **집중호우, 조류 다량 발생 등 원수 수질 악화 시 정수처리 공정 운영 강화**

- ▶ 목표 수질 유지를 위해 pH 조절제 주입, 응집제 등 약품주입 상향

- 소형생물 대응 제거시설 설치 운영, 오존 주입 및 세척 주기 강화
 - 전체 활성탄지 스트레이너 설치 완료 : (기준) 144개소 → (강화) 160개소
 - 오존 주입량 : (비활동기) 0.2~0.5mg/L → (강화) 0.8mg/L 이상
 - 활성탄지 역세척 주기 : (비활동기) 4~7일 → (강화) 3~5일
- ※ 원수 소형생물 발생 현황(5.15. 기준) : 일 평균 2마리/톤 유입 (정수처리 과정에서 모두 제거)

□ 향후계획

- 여름철 수질관리 대책 시행 및 신속 대응체계 확립 유지 …… ’26. 6 ~ 10월

② 재난(풍수해, 폭염 등) 대응 및 비상 급수지원

□ 사업개요

- 여름철 풍수해 및 폭염 등 대비 재난안전대책본부 구성 가동
- 폭염, 폭우로 인한 재난발생 대비 병물아리수 공급 및 비상급수 지원

□ 추진내용

- 재난안전대책본부 구성 및 운영
 - 운영기간 : 2026. 5. 15.(금) ~ 10. 15.(목) <5개월>
 - 구 성 : 본부장 산하 위기대응 임무별 총괄지원관 및 4개 실무반으로 구성

구분	총괄지원관	총괄지원반	현장조치반	급수대책반	생산관리반
임무	재 난 수 습 총 괄 지 원	행정지원,질서유지 재 난 홍 보	상 황총 괄, 시설 복구, 자원지원	생활·통신지원, 교 통 대 책	현장 환경정비,의료 에너지 복구,구조

- 운 영 : 단계별(1~3단계) 비상근무 및 재난안전 SNS 활용 체계적 상황전파 및 대응
 - ▶ 서울아리수본부 재난안전 ‘카카오톡 단체방’ 운영 (기상 및 현장상황 공유)
- 폭염 취약 계층(노숙자 등) 대상 병물아리수 공급 및 재난 시 비상급수 지원
 - (폭염기간) ① 이동노동자 쉼터, 노숙인 시설 중심 **나눔냉장고 운영**
 - ② 시 지활지원과 협의를 통해 재난 취약 현장(쪽방상담소 등) **아리수 병물 공급**
 - (재난발생) 급수차, 비상급수대, 물탱크, 이동식 급수팩 등 **비상급수 추가 지원**

				
나눔냉장고 운영	급수차(8대)	급수대(28대)	급수팩 28,500매(5L)	물탱크 10개(3톤)

□ 향후계획

- 폭염 취약계층 대상 음용수 지원 '26. 6 ~ 9월
- 재난안전대책본부 운영 '26. 6 ~ 10월

③ 상수도 시설물 및 공사장 안전관리

□ 사업개요

- 여름철 집중호우, 폭우로 인한 상수도 시설물 피해 사전 예방

(단위:개소)

구 분	시설물								대 형 공사장
	계	취정수장	배수지	가압장	현수관로	공동구	공사장노출관	공공 청사	
대 상	422	10	102	222	53 (9.85km)	8 (32.4km)	8 (4.53km)	17	2

- 상수도 공사장 안전 확보 및 자연재해로부터 근로자 건강 보호

□ 추진내용

- **풍수해 기간** 주요 시설물 및 공사장 안전 점검 (총 422개소)
 - (점검기간) '26. 5. 11.(월) ~ 6. 19.(금) <40일간>
 - (점검방법) 본부, 사업소(정수센터), 외부전문가 합동점검
 - (점검내용) 축대·옹벽 안전상태, 배수로 정비상태, 공사장 작업절차 준수여부 등
- **폭염 기간** 상수도 공사장 근로자 안전대책 점검
 - (점검기간) '26. 5. 15.(금) ~ 10. 15.(목) 폭염대책 기간 중 폭염 발효 시
 - (점검방법) 본부, 사업소, 감리(감독) 일일 현장점검 추진
 - (점검내용) 공사장 폭염대비 안전물품 비치 및 근로자 안전보건 확보 여부 등
 - ▶ 냉방물품 비치(물, 선풍기 등), 무더위 쉼터설치, 폭염시 행동요령 숙지, 휴식시간 제공 등

□ 향후계획

- 풍수해 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전점검 '26. 6 ~ 8월
- 폭염 기간 공사장 근로자 안전관리 점검 '26. 6~ 10월
- 태풍 발생 시 시설물 및 공사장 긴급 점검 실시 '26. 6~ 10월

□ 세입 결산

- 세입예산 현액 1조 1,449억원에 대하여

징수결정액은 1조 1,608억원, 실제수납액은 1조 1,366억원이고,

결손처분액은 6억원, 다음연도로 이월되는 미수금은 237억원임

(단위: 백만원)

구분	예산현액 (A)	징수 결정액 (B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	미수금처리		조정률 (B/A)	징수율 (C/B)
					결손 처분	다음연도 이월		
2025	1,144,918	1,160,840	1,136,580	24,260	574	23,686	101.4%	97.9%
2024	1,020,432	1,143,985	1,121,036	22,949	371	22,578	112.1%	98.0%
증감	124,486	16,855	15,544	1,311	203	1,108	△10.7%	0.1%

□ 세출 결산

- 세출예산 현액 1조 1,449억원에 대하여

지출액은 1조 86억원, 다음연도 이월액은 501억원, 불용액은 862억원임

(단위: 백만원)

구분	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액(C)			불용액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)	불용률 (D/A)
			계	건설개량 이월	사고이월			
2025	1,144,918	1,008,598	50,139	5,504	44,635	86,181	88.1	7.5
2024	1,020,432	893,778	28,728	5,542	23,186	97,925	87.6	9.6
증감	124,486	114,820	21,411	△38	21,449	△11,845	0.5	△2.1

1. 2025년 예산집행 현황

(1) 총 괄

(단위:백만원,%)

구 분		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
합 계		1,144,918	1,008,598	50,139	86,181	88.1	4.4	7.5
사업 예산		827,945	726,620	50,139	51,186	87.8	6.0	6.2
일반 예산		316,973	281,978	0	34,995	89.0	0.0	11.0
일 반 예 산	행정운영경비	193,471	187,594	0	5,877	97.0	0.0	3.0
	(인 건 비)	181,155	177,456	0	3,699	98.0	0.0	2.0
	(기본경비)	12,316	10,138	0	2,178	82.3	0.0	17.7
	재무활동비	114,040	94,384	0	19,656	82.8	0.0	17.2
	(차입금 이자)	967	963	0	4	99.5	0.0	0.5
	(반환금 등)	26,883	7,231	0	19,652	26.9	0.0	73.1
	(예탁금)	86,190	86,190	0	0	100.0	0.0	0.0
	예 비 비	9,462	0	0	9,462	0.0	0.0	100.0

※ 예산현액 = '25년 당초(1조 300억원) + '25년 추경(862억원) + '24년 이월액(287억원)

- '25.12.31.기준 예산현액 1조 1,449억원 중 1조 86억원 지출하여 집행률은 88.1%, 501억원 이월하여 이월률 4.4%, 862억원 불용하여 불용률 7.5%임

(2) 사업별 예산집행 세부현황

('25.12.31.기준, 단위:백만원, %)

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
계		827,945	726,620	50,139	51,186	87.8	6.0	6.2
1	경 영 실 적 평 가	211	208	0	3	98.5	0.0	1.5
2	단 기 해 외 연 수 운 영	254	240	0	14	94.7	0.0	5.3
3	상수도 인력의 전문화	1,102	974	0	128	88.4	0.0	11.6
4	상수도 행정서비스 지원	7,927	6,977	0	950	88.0	0.0	12.0
5	수도사업 대외협력 강화	275	202	0	73	73.4	0.0	26.6
6	시민과 소통하는 아리수 홍보	4,224	3,994	0	230	94.6	0.0	5.4
7	아 리 수 누 리 집 재 구 축 및 운 영	870	827	0	43	95.1	0.0	4.9
8	아리수 현장교육센터 운영	418	319	0	99	76.4	0.0	23.6
9	직원 후생복지제도 운영	6,897	6,525	0	372	94.6	0.0	5.4
10	청 사 유 지 관 리	4,716	4,048	0	668	85.8	0.0	14.2
11	행 정 장 비 확 충 및 청 사 환 경 개 선	7,066	6,138	519	409	86.9	7.3	5.8
12	수 도 계 량 기 검 칩 및 고 지 서 송 달	27,815	27,754	0	61	99.8	0.0	0.2
13	수 도 계 량 기 교 체	23,096	21,490	21	1,585	93.0	0.1	6.9
14	수도계량기 스마트 검침 전환	10,002	8,190	0	1,812	81.9	0.0	18.1

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
15	수 도 요 금 부 과 징 수	1,154	917	0	237	79.5	0.0	20.5
16	토 지 회 계 이 관 취 득	409	409	0	0	100.0	0.0	0.0
17	행 정 정 보 시 스템 구 축	7,161	6,826	0	335	95.3	0.0	4.7
18	행 정 정 보 시 스템 유 지 관 리	4,038	3,916	0	122	97.0	0.0	3.0
19	강북~영등포 비상관로 연결	900	810	90	0	90.0	10.0	0.0
20	급 수 공 사	25,200	24,727	260	213	98.1	1.0	0.8
21	녹 물 걱 정 없 는 클 린 닥 터 서 비 스	6,054	3,134	0	2,920	51.8	0.0	48.2
22	대 형 상 수 도 관 세 척	10,000	9,520	0	480	95.2	0.0	4.8
23	배 급 수 관 신 설 및 연 결	2,093	1,742	0	351	83.2	0.0	16.8
24	봉 은 및 삼 성 배 수 지 급 수 공 급 체 계 개 선	3,058	1,459	1,208	391	47.7	39.5	12.8
25	봉 현 배 수 지 증 설	345	245	77	23	71.0	22.4	6.6
26	상 수 도 블 록 시 스템 공 급 체 계 구 축	21,923	17,922	3,155	846	81.8	14.4	3.9
27	소 블 록 배 수 관 세 척	6,446	5,973	0	473	92.7	0.0	7.3
28	수도정비계획(변경) 수립	500	500	0	0	100.0	0.0	0.0
29	수질자동감시시스템 유지관리	3,103	2,403	0	700	77.4	0.0	22.6
30	아 리 수 음 수 대 설 치 및 유 지 관 리	4,413	3,932	0	481	89.1	0.0	10.9
31	암 사 정 수 장 재 정 비	250	250	0	0	100.0	0.0	0.0

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
32	정체수 자동배출장치 설치	1,280	1,209	0	71	94.5	0.0	5.5
33	병 물 아 리 수 공 급	678	637	0	41	93.9	0.0	6.1
34	수돗물 평가위원회 운영	157	132	0	25	84.1	0.0	15.9
35	아리수 생산재료비(동력비)	89,170	89,132	0	38	100.0	0.0	0.0
36	아 리 수 생 산 재 료 비 (슬 러 지 케 익 처 리 비)	7,300	4,886	0	2,414	66.9	0.0	33.1
37	아리수 생산재료비 (약품비)	12,432	11,063	0	1,369	89.0	0.0	11.0
38	아 리 수 생 산 재 료 비 (원 수 구 입 비)	55,342	52,908	0	2,434	95.6	0.0	4.4
39	아 리 수 생 산 재 료 비 (입 상 활 성 탄 구 매)	3,173	2,426	96	651	76.4	3.0	20.5
40	아 리 수 품 질 확 인 제	4,358	3,797	0	561	87.1	0.0	12.9
41	영 등 포 아 리 수 정 수 센 터 병 물 동 생 산 시 설 개 선	1,270	225	892	153	17.7	70.3	12.1
42	정수센터 시설 유지보수	29,025	25,976	526	2,523	89.5	1.8	8.7
43	정 수 센 터 시 설 정 비	63,507	44,960	6,484	12,063	70.8	10.2	19.0
44	강북~암사 송수계통 연결	2,516	786	1,730	0	31.2	68.8	0.0
45	강 북 정 수 장 증 설	10,719	8,800	1,696	223	82.1	15.8	2.1
46	광암수계 배수관로 정비	13,208	10,173	3,013	22	77.0	22.8	0.2
47	광암정수센터 취수원 안정화	3,890	115	3,775	0	3.0	97.0	0.0

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
48	광암정수장 고도증설 및 재정비	8,821	349	8,472	0	4.0	96.0	0.0
49	까 치 산 배 수 지 건 설	2,975	2,380	569	26	80.0	19.1	0.9
50	배 수 지 · 가 압 장 노 후 기 전 시 설 개 량	10,753	9,572	0	1,181	89.0	0.0	11.0
51	미 아 배 수 지 건 설	3,913	1,401	2,492	20	35.8	63.7	0.5
52	배 수 지 내 부 방 식	12,290	10,302	544	1,444	83.8	4.4	11.8
53	배수지·가압장 유지보수	7,054	5,960	805	289	84.5	11.4	4.1
54	상 수 도 G I S 구 축	3,971	3,871	0	100	97.5	0.0	2.5
55	상수도 밸브실 점검 및 정비	5,294	4,471	0	823	84.5	0.0	15.5
56	상 수 도 시 설 물 정 밀 안 전 진 단 및 점 검	4,055	3,151	220	684	77.7	5.4	16.9
57	상 수 도 관 누 수 복 구	61,619	61,145	0	474	99.2	0.0	0.8
58	상 수 도 관 전 식 방 지	857	624	0	233	72.8	0.0	27.2
59	수도자재 관리센터 이전	4,401	438	2,148	1,815	10.0	48.8	41.2
60	수운영정보 시스템 유지관리	557	538	0	19	96.6	0.0	3.4
61	시설물 유지관리 부담금	4,390	3,831	0	559	87.3	0.0	12.7
62	유량계 교정검사 및 유지보수	1,479	1,194	0	285	80.7	0.0	19.3
63	유 량 계 설 치	522	468	0	54	89.7	0.0	10.3

사 업 명		예산현액	지출금액	이월액	불용액	집행률	이월률	불용률
64	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,184	1,098	0	86	92.7	0.0	7.3
65	장 기 사 용 배 급 수 관 (3 5 0 mm 이 하) 정 비	77,277	75,892	0	1,385	98.2	0.0	1.8
66	장 기 사 용 송 배 수 관 (4 0 0 mm 이 상) 정 비	75,593	62,740	11,347	1,506	83.0	15.0	2.0
67	안 전 보 건 관 리 강 화	1,272	1,137	0	135	89.4	0.0	10.6
68	수 도 시 험 연 구	217	196	0	21	90.4	0.0	9.6
69	수도시험 연구장비 확충	1,469	1,392	0	77	94.8	0.0	5.2
70	수 질 시 험 연 구	1,745	1,541	0	204	88.3	0.0	11.7
71	수질시험 연구장비 확충	1,867	1,725	0	142	92.4	0.0	7.6
72	소블록 배급수관망 개선	3,200	3,179	0	21	99.3	0.0	0.7
73	배수지 물탱크 청 소	3,850	3,215	0	635	83.5	0.0	16.5
74	배수지 소방설비 확충	638	565	0	73	88.6	0.0	11.4
75	배수지 확충 종합계획	168	168	0	0	100.0	0.0	0.0
76	배수지·가압장 등 기전설비 유지관리	5,406	4,620	0	786	85.5	0.0	14.5
77	노 후 밸 브 정 비	31,100	29,598	0	1,502	95.2	0.0	4.8
78	모바일 수질감시시스템 구축	62	62	0	0	100.0	0.0	0.0

VI

2026 예산집행 현황

(1) 총괄

('26.5.15. 단위:백만원,%)

구분		예산현액	원인행위액	원인집행률	지출집행액	지출집행률
합계		1,150,139	450,614	39.2	278,875	24.2
사업 예산		920,327	366,690	39.8	197,424	21.5
일반 예산		229,812	83,924	36.5	81,451	35.4
일반 예산	행정운영경비	201,986	83,388	41.3	80,915	40.1
	(인건비)	187,417	76,460	40.8	74,027	39.5
	(기본경비)	14,569	6,928	47.6	6,888	47.3
	재무활동비	17,122	536	3.1	536	3.1
	(차입금이자)	965	241	25.0	241	25.0
	(반환금 등)	16,157	295	1.8	295	1.8
	예비비	10,704	0	0.0	0	0.0

※ 예산현액 = '26년 당초 예산액(1,100,000백만원) + '25년 이월예산액(50,139백만원)

- '26. 5. 15. 현재 예산현액 1조 1,501억원 중 4,506억원을 원인행위하여
원인집행률은 39.2%이고, 그 중 2,789억원을 지출하여 지출 집행률은 24.2%임
- 사업예산 은 9,203억원 중 3,667억원 원인집행(원인집행률 39.8%)
1,974억원 지출집행(지출집행률 21.5%)
- 일반예산 은 2,298억원 중 839억원 원인집행(원인집행률 36.5%)
815억원 지출집행(지출집행률 35.4%)

(2) 사업별 예산집행 세부현황

('26.5.15. 단위:백만원,%)

연번	사 업 명	예산현액	원 인 행위액	원 인 집행률	지 출 집행액	지 출 집행률	집행잔액
	계	920,327	366,690	39.8	197,424	21.5	722,903
1	경 영 실 적 평 가	209	197	94.3	197	94.3	12
2	단 기 해 외 연 수 운 영	254	0	0.0	0	0.0	254
3	상 수 도 인 력 의 전 문 화	962	276	28.7	259	26.9	703
4	상 수 도 행 정 서 비 스 지 원	7,894	2,825	35.8	2,796	35.4	5,098
5	수 도 사 업 대 외 협 력 강 화	640	60	9.4	20	3.1	620
6	시민과 소통하는 아리수 홍보	3,990	1,693	42.4	980	24.6	3,010
7	아리수 누리집 재구축 및 운영	255	230	90.2	58	22.7	197
8	아리수 현장교육센터 운영	272	114	41.9	55	20.2	217
9	직 원 후 생 복 지 제 도 운 영	6,783	3,377	49.8	3,375	49.8	3,408
10	청 사 유 지 관 리	4,777	1,735	36.3	1,511	31.6	3,266
11	행정장비 확충 및 청사 환경개선	8,068	2,747	34.0	1,093	13.5	6,975
12	수도계량기 검침 및 고지서 송달	27,543	11,005	40.0	11,005	40.0	16,538
13	수 도 계 량 기 교 체	25,278	5,388	21.3	4,017	15.9	21,261
14	수도계량기 스마트 검침 전환	10,015	2,471	24.7	2,218	22.1	7,797
15	수 도 요 금 부 과 징 수	1,588	1,132	71.3	685	43.1	903
16	토 지 회 계 이 관 취 득	551	404	73.3	404	73.3	147
17	행 정 정 보 시 스템 구 축	5,484	4,680	85.3	1,887	34.4	3,597
18	행 정 정 보 시 스템 유 지 관 리	4,168	3,680	88.3	1,872	44.9	2,296
19	강북~영등포 비상관로 연결	1,229	854	69.5	546	44.4	683
20	거 마 배 수 지 재 건 설	237	0	0.0	0	0.0	237

연번	사 업 명	예산현액	원 인 행위액	원 인 집행률	지 출 집행액	지 출 집행률	집행잔액
21	급 수 공 사	20,574	4,590	22.3	4,588	22.3	15,986
22	녹물 걱정없는 클린닥터 서비스	3,491	468	13.4	454	13.0	3,037
23	대 형 상 수 도 관 세 척	11,000	4,302	39.1	1,202	10.9	9,798
24	매 봉 재 배 수 지 신 설	300	0	0.0	0	0.0	300
25	배 급 수 관 신 설 및 연 결	3,223	419	13.0	382	11.9	2,841
26	봉 은 및 삼 성 배 수 지 급 수 공 급 체 계 개 선	7,806	3,295	42.2	382	4.9	7,424
27	봉 현 배 수 지 증 설	514	157	30.5	133	25.9	381
28	상수도 블록시스템 공급체계 구축	25,547	12,005	47.0	4,685	18.3	20,862
29	소 블 록 배 수 관 세 척	6,446	3,108	48.2	684	10.6	5,762
30	수도정비계획(변경) 수립	660	660	100.0	396	60.0	264
31	수질자동감시시스템 유지관리	2,931	1,356	46.3	544	18.6	2,387
32	아리수 음수대 설치 및 유지관리	4,194	2,217	52.9	1,427	34.0	2,767
33	암 사 정 수 장 재 정 비	194	194	100.0	116	59.8	78
34	정 체 수 자동배출장치 설치	1,280	801	62.6	559	43.7	721
35	병 물 아 리 수 공 급	589	102	17.3	34	5.8	555
36	수돗물 평가위원회 운영	156	101	64.7	30	19.2	126
37	아리수 생산재료비 (동력비)	93,769	35,472	37.8	31,711	33.8	62,058
38	아 리 수 생 산 재 료 비 (슬 러 지 케 익 처 리 비)	5,631	1,962	34.8	1,237	22.0	4,394
39	아리수 생산재료비 (약품비)	12,513	3,088	24.7	2,298	18.4	10,215
40	아리수 생산재료비 (원수구입비)	54,159	16,818	31.1	16,818	31.1	37,341
41	아 리 수 생 산 재 료 비 (입 상 활 성 탄 구 매)	7,827	1,625	20.8	85	1.1	7,742
42	아 리 수 품 질 확 인 제	4,300	1,211	28.2	1,035	24.1	3,265

연번	사 업 명	예산현액	원 인 행위액	원 인 집행률	지 출 집행액	지 출 집행률	집행잔액
43	영 등 포 아 리 수 정 수 센 터 병 물 동 생 산 시 설 개 선	892	886	99.3	321	36.0	571
44	정 수 센 터 시 설 유 지 보 수	33,550	12,578	37.5	3,039	9.1	30,511
45	정 수 센 터 시 설 정 비	59,882	22,062	36.8	6,842	11.4	53,040
46	강 북 ~ 암 사 송 수 계 통 연 결	3,984	0	0.0	0	0.0	3,984
47	강 북 정 수 장 증 설	29,518	25,027	84.8	6,834	23.2	22,684
48	광 암 수 계 배 수 관 로 정 비	16,013	8,883	55.5	260	1.6	15,753
49	광 암 정 수 센 터 취 수 원 안 정 화	7,292	0	0.0	0	0.0	7,292
50	광 암 정 수 장 고 도 증 설 및 재 정 비	17,472	8,054	46.1	1,073	6.1	16,399
51	기 전 설 비 유 지 관 리 (배 수 지 · 가 압 장)	5,395	2,204	40.9	1,140	21.1	4,255
52	까 치 산 배 수 지 건 설	8,545	6,589	77.1	1,520	17.8	7,025
53	노 후 기 전 시 설 개 량 (배 수 지 · 가 압 장)	9,912	2,352	23.7	653	6.6	9,259
54	미 아 배 수 지 건 설	9,492	5,168	54.4	1,852	19.5	7,640
55	배 수 지 내 부 방 식	10,839	5,189	47.9	2,743	25.3	8,096
56	배 수 지 청 소	4,031	1,477	36.6	93	2.3	3,938
57	배 수 지 · 가 압 장 시 설 물 유 지 보 수	4,676	1,375	29.4	1,223	26.2	3,453
58	상 수 도 G I S 구 축	3,989	3,254	81.6	153	3.8	3,836
59	상 수 도 밸 브 정 비 및 설 치	34,799	8,883	25.5	7,667	22.0	27,132
60	상 수 도 밸 브 실 점 검 및 정 비	2,896	1,459	50.4	0	0.0	2,896
61	상 수 도 시 설 물 정 밀 안 전 진 단 및 점 검	3,296	1,674	50.8	224	6.8	3,072
62	상 수 도 관 누 수 복 구	63,211	20,863	33.0	20,266	32.1	42,945
63	상 수 도 관 전 식 방 지	998	695	69.6	0	0.0	998
64	수 도 자 재 관 리 센 터 이 전	2,148	2,030	94.5	3	0.1	2,145

연번	사 업 명	예산현액	원 인 행위액	원 인 집행률	지 출 집행액	지 출 집행률	집행잔액
65	수운영정보 시스템 유지관리	682	618	90.6	216	31.7	466
66	스마트 유량감시 시스템 구축	388	308	79.4	215	55.4	173
67	시설공사 하자관리 통합지원	79	0	0.0	0	0.0	79
68	시 설 물 유 지 관 리 부 담 금	3,995	4	0.1	4	0.1	3,991
69	유량계 교정검사 및 유지보수	1,503	1,114	74.1	240	16.0	1,263
70	유 량 계 설 치	575	356	61.9	111	19.3	464
71	유수율 관리를 위한 누수탐사	1,136	280	24.6	280	24.6	856
72	장기사용 배급수관(350mm이하) 정비	85,112	43,793	51.5	24,500	28.8	60,612
73	장기사용 송배수관(400mm이상) 정비	111,179	40,119	36.1	13,460	12.1	97,719
74	안 전 보 건 관 리 강 화	1,012	356	35.2	177	17.5	835
75	수 도 시 험 연 구	408	190	46.6	69	16.9	339
76	수 도 시 험 연 구 장 비 확 충	894	567	63.4	161	18.0	733
77	수 질 시 험 연 구	1,697	1,185	69.8	98	5.8	1,599
78	수 질 시 험 연 구 장 비 확 충	1,536	279	18.2	209	13.6	1,327
