

현안업무보고


2025. 9.

정원도시국

I. 일 반 현 황

1 조직 및 인력

조 직 7과 5사업소

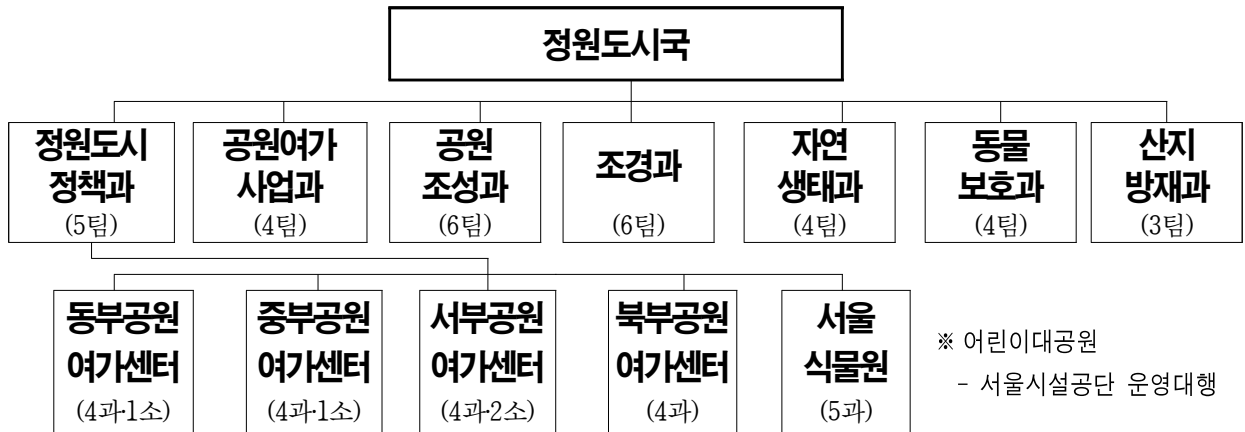

인 력

(‘25. 8월 기준, 단위 : 명)

구 분		정원	현원
합 계		435	431
본 청	소 계 (7) (정원도시정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 동물보호과, 산지방재과)	145	150
사업소 (4급)	소 계 (5)	290	281
	동부공원여가센터 (6개 공원)	56	54
	중부공원여가센터 (5개 공원, 4개 광장)	74	69
	서부공원여가센터 (7개 공원)	74	72
	북부공원여가센터 (4개 공원)	36	34
	서울식물원 (2개 공원, 4개 양묘장)	50	52

주요기능

구분	담당업무
정원도시정책과	○ 매력가든·동행가든 조성, 2040 공원녹지기본계획 수립 등 ○ 시공원 보수·정비, 어린이대공원 감독, 개발제한구역 관리, CSR 대외협력사업
공원여가사업과	○ 공원·산림 등 여가·문화 프로그램 기획·운영·홍보 등 ○ 친환경 농장, 도시텃밭 조성 및 지원에 관한 사항
공원조성과	○ 장기미집행 도시공원 보상, 도시자연공원구역 협의매수, 공원조성계획 결정(변경) ○ 도시공원위원회 운영, 생활밀착형 공원 조성, 공원 내 책심터 조성 등
조경과	○ 서울정원박람회, 정원문화 확산 캠페인 추진, 도시계획시설(녹지) 조성·재정비 ○ 자녀안심 그린숲, 가로수 식재·관리, 서울광장숲, 옥상정원, 사계절 꽃길 조성 등
자연생태과	○ 서울둘레길 조성관리, 자연휴양림 조성, 비람길숲 조성, 유아숲 체험시설 조성 ○ 산불방지대책, 산림병해충 방제, 하천생태 복원·녹화, 생태계보호지역 지정·관리
동물보호과	○ 동물복지종합계획 수립, 동물보호센터 및 동물복지시설 설치·운영 ○ 가축위생·방역, 반려·유기동물 보호관리, 축산·수산업 진흥 및 지원
산지방재과	○ 사면안전 종합계획 수립, 산사태 대책상황실·산사태현장예방단 운영 ○ 사면 관리, 산사태 예보 및 대피체계 구축, 산사태 예방사업 등
동부공원여가센터	○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획·운영 등 (천호공원, 시민의숲, 길동생태공원, 서울숲, 응봉공원, 율현공원)
중부공원여가센터	○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획·운영 등 (남산공원, 낙산공원, 용산가족공원, 서울로7017, 율곡로 상부공원, 서울광장, 광화문광장, 열린송현녹지광장, 의정부지역사유적광장)
서부공원여가센터	○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획·운영 등 (월드컵공원, 서서울호수공원, 선유도공원, 경의선숲길, 여의도공원, 보라매공원, 문화비축기지)
북부공원여가센터	○ 공원 시설물 관리, 공원 이용프로그램 기획·운영 등 (북서울꿈의숲, 경춘선숲길, 서울창포원, 중랑캠핑숲)
서울식물원	○ 식물원 시설물 관리, 식물원 행사·프로그램 기획·운영, 식물 연구·관리 등 (서울식물원, 푸른수목원, 양묘장)


2 2025년 예산현황

총괄

(‘25. 8월 기준, 단위 : 백만원)

구분	2025년	2024년	증감	증감률
세입예산	345,454	66,853	278,601	416.7%
세출예산	764,934	433,229	331,705	76.6%

※ '25년 장기미집행 도시공원 보상 관련 지방채 원금 상환 2,800억원 신규 편성,
서울대공원(세입 18,105백만원, 세출 39,626백만원) 제외

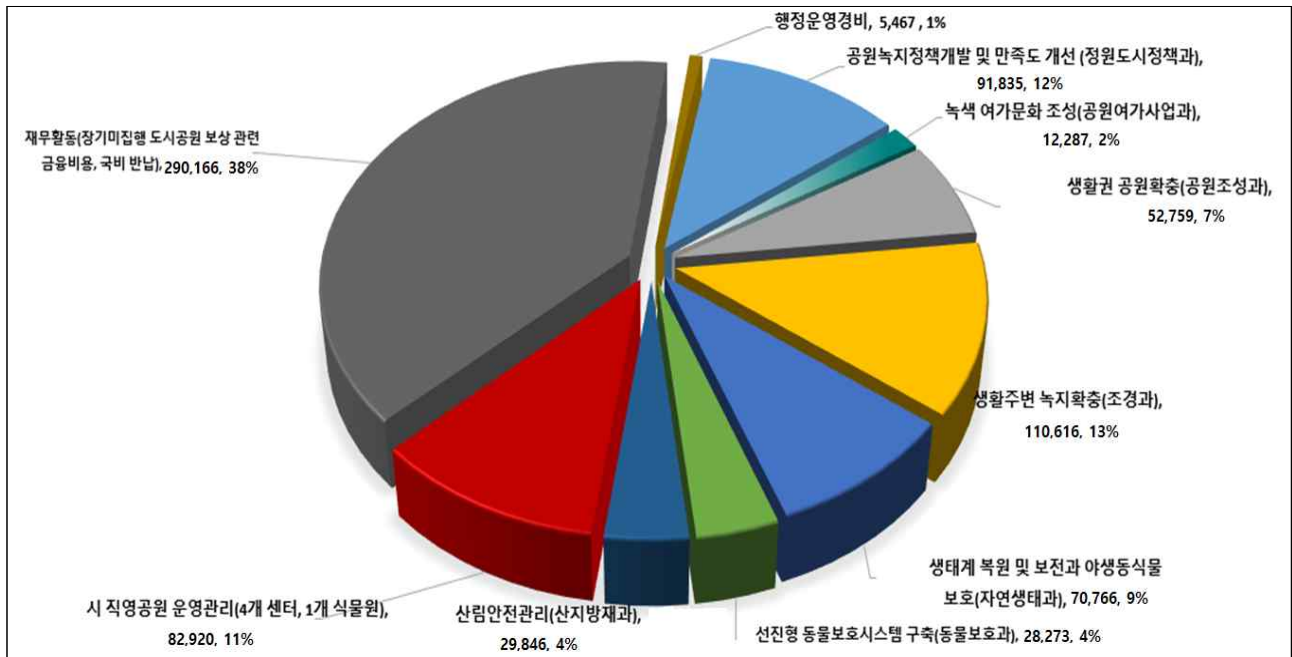

세출현황

※ 최근 5년 현황

(‘25. 8월 기준, 단위 : 백만원)

구분	예산액	전년대비 증감액	전년대비 증감률	비고
2025년	764,934	331,705	76.6%	
2024년	433,229	△74,139	△14.6%	
2023년	507,368	△8,087	△1.6%	
2022년	515,455	△310,541	△37.6%	
2021년	825,996	213,713	34.9%	

정책과제별 세출예산

(‘25. 8월 기준, 단위 : 백만원)

정책과제	부서명	정 책 사 업		단위 사업 (개수)	예산액
		사 업 명	개수		
합 계			25	51	764,934
공 원 녹 지 정 책 개 발 및 관 리	소 계		12	21	174,343
	정 원 도 시 정 책 과	공원녹지 정책개발 및 만족도 개선 행정운영경비	2	4	92,168
	공 원 여 가 사 업 과	녹색 여가문화 조성 행정운영경비	2	4	12,325
	동 부 공 원 여 가 센 터	공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원 행정운영경비	2	2	15,492
	중 부 공 원 여 가 센 터	서울의 대표공원인 남산의 세계화 행정운영경비	2	4	15,159
	서 부 공 원 여 가 센 터	세계적인 환경·생태 테마공원 육성 행정운영경비	2	3	28,488
	북 부 공 원 여 가 센 터	문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영 행정운영경비	2	4	10,711
녹 색 공 간 확 충	소 계		5	13	443,654
	공 원 조 성 과	생활권 공원 확충 행정운영경비, 재무활동	3	5	342,987
	조 경 과	생활주변 녹지 확충 행정운영경비	2	8	100,667
자 연 환 경 보 전 및 동 물 보 호 시 슼 템 구 축	소 계		6	14	117,058
	자 연 생 태 과	생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 행정운영경비	2	6	70,812
	동 물 보 호 과	선진형 동물보호시스템 구축 행정운영경비	2	5	28,312
	서 울 식 물 원	식물종다양성 보전을 통한 세계적 수준의 식물원 운영 행정운영경비	2	3	17,934
도 시 사 방 선 도	소 계		2	3	29,879
	산 지 방 재 과	산림안전관리 행정운영경비	2	3	29,879

3 자원현황

공 원 - 2,984개소, 173.08 km^2 ('24. 1월 기준)

구 분	공 원 수 (개소)	면 적 (km^2)
합 계	2,984	173.08
도시자연공원구역	68	69.22
도시계획시설(공원)	2,235	50.09
자연공원(국립공원)	1	37.52
기 타 공 원 (유원지, 강변공원, 마을마당 등)	680	16.25

※ 행정구역 605.21 km^2 대비 28.59% (1인당 공원면적 17.96 m^2)

가 로 수 - 62종, 295천주 ('25. 8월 기준)

○ 은행(35%), 양버즘(16%), 느티(13%), 벚(12%), 이팝(9%), 회화·메타세콰이아 등(15%)

녹 지 대 - 8,516개소, 16.33 km^2 ('25. 8월 기준)

구 분	계	일반녹지대	시설녹지	기타
개소 수(개소)	8,516	2,973	953	4,590
면적(km^2)	16.33	5.12	3.76	7.45

개발제한구역 - 149.10 km^2 (행정구역의 24.64%) ('25. 8월 기준)

구 분	계	대 지	전	답	임 야	기 타
면적(km^2)	149.1	2.68	6.10	6.67	100.40	33.25
비율(%)	100	1.80	4.09	4.47	67.34	22.30

생태경관보전지역 - 18개소, 5.2 km^2 ('25. 8월 기준)

○ 하천생태계 6개소(2.4 km^2), 습지생태계 4개소(0.1 km^2), 산림생태계 8개소(2.7 km^2)

II. 정책목표 및 정책과제

비전

마력 가득한 **정원** 도시, 서울

목표

정원에서 시작되는 일상 속 행복 **‘5분 정원도시’** 구현

추진
방향

시민의
일상이 행복한
정원 인프라 확충

일상에 여유를
더하는
정원 여가 활성화

안전하고
지속가능한
공원 관리·운영

정책
과제

정원도시
서울

- 매력가든·동행가든 프로젝트 추진
- 2025 서울국제정원박람회 추진
- 거점형 특화정원 조성
- 생활밀착형 공원 조성 및 공원용지 적극 확보
- 도심 내 역사·녹지공간 조성
- 단절된 남산, 관악산 녹지축 연결 추진

정원문화
확산

- 정원·치유여가 프로그램 운영
- 숲과 산이 어우러진 도심 속 휴식공간 조성
- 남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성
- 모두가 즐기는 자연 속 놀이·체험공간 조성

안전·안심
생태 도시

- 안전한 산림 관리를 위한 산불방지 대책
- 풍수해 대비 산사태 예방대책 추진

동물 공존
반려 환경

- 서울 반려동물 테마파크·추모관(연천) 조성
- 올바른 반려동물 문화 조성을 위한 대시민 서비스 확대

Ⅲ. 제332회 시의회 현안업무보고

① 시민의 일상이 행복한 「정원도시, 서울」

- 1-1 매력가든·동행가든 프로젝트 추진
- 1-2 2025 서울국제정원박람회 추진
- 1-3 거점형 특화정원 조성
- 1-4 생활밀착형 공원 조성 및 지속적인 공원용지 적극 확보
- 1-5 도심 내 역사·녹지공간 조성
- 1-6 단절된 남산, 관악산 녹지축 연결 추진

② 정원이 건넌 휴식, 정원 문화 확산

- 2-1 정원·치유여가 프로그램 운영
- 2-2 숲과 산이 어우러진 도심 속 휴식공간 조성
- 2-3 남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성
- 2-4 모두가 즐기는 자연 속 놀이·체험공간 조성

③ 안전하고 건강한 숲·공원 관리·운영

- 3-1 안전한 산림 관리를 위한 산불방지 대책
- 3-2 풍수해 대비 산사태 예방대책 추진

④ 사람과 동물이 함께 어울리는 반려환경 조성

- 4-1 서울 반려동물 테마파크·추모관(연천) 조성
- 4-2 올바른 반려동물 문화 조성을 위한 대시민 서비스 확대

1. 시민의 일상이 행복한 「정원도시, 서울」

- 1-1. 매력가든 · 동행가든 프로젝트 추진
- 1-2. 2025 서울국제정원박람회 개최
- 1-3. 거점형 특화공원 조성
- 1-4. 생활밀착형 공원 조성 및 지속적인 공원용지 확보
- 1-5. 도심 내 역사·녹지공간 조성
- 1-6. 단절된 남산, 관악산 녹지축 연결 추진



1-1 매력가든 · 동행가든 프로젝트 추진

정원도시정책과장 : 안수연 ☎2133-2010 공원녹지기획팀장 : 구동근 ☎2021 담당 : 성현수 ☎2023

‘정원도시 서울’ 시민 체감도 향상을 위한 매력가든·동행가든 조성을 통해 정원 문화 확산 및 시민 라이프 스타일 혁신

□ 사업개요


- 주요내용 : '26년까지 매력가든·동행가든 1,007개소(131만㎡) 조성
 - (매력가든) 도심 곳곳, 일상 속 변화와 다채로움이 가득한 공공정원
 - (동행가든) 어르신 · 장애인 · 어린이 등 약자와 함께하는 배려와 동행의 정원
 - (정원문화 확산) 참여 기반 정원 조성으로 시민 라이프스타일 변화 유도
- 총사업비 : 265,977백만원 ('24년 78,168, '25년 100,817, '26년 86,992)
- 연차별 추진계획 : ('24) 335개소, ('25) 340개소, ('26) 332개소

□ 추진실적

- 매력가든·동행가든 총 955개소, 618,947㎡ 조성 ※ '25.7월 기준

구분		총계	2024년	2025년(7월말)	비고
개소수	소계	955개소	536개소	419개소	
	매력가든	918개소	514개소	404개소	
	동행가든	37개소	22개소	15개소	
면적	소계	618,947㎡	418,697㎡	200,250㎡	
	매력가든	603,517㎡	409,023㎡	194,494㎡	
	동행가든	15,430㎡	9,674㎡	5,756㎡	


※ 시비 및 구비사업 포함



<매력정원(안양천)>



<옥상정원(명일공원)>



<생태정원(오동공원)>

□ 추진일정

- 매력가든, 동행가든 조성 : ~ '26. 12.

1-2


2025 서울국제정원박람회 추진

조경과장: 온수진 ☎2133-2101 조경기획팀장: 차윤정 ☎2109 담당: 권지현 · 김현화 · 손지연 ☎2112, 2129, 2113

서울의 대표 밀리언셀러 정책인 ‘서울국제정원박람회’의 추진을 통해 ‘정원도시 서울’ 브랜드의 세계적 확산과 정원문화 대중화에 기여


□ 사업개요

- 사업명 : 2025 서울국제정원박람회
(Seoul International Garden Show 2025)
- 대상지 : 보라매공원
- 개최기간 : '25. 5. 22. ~ 10. 20.
- 행사시간 : 12:00 ~ 19:00 (7~8월 : 14:00 ~ 21:00)
- 주 제 : Seoul, Green Soul(정원과의 교감)
- 내 용 : 국제공모·시민 및 기업 참여 통한 정원 조성, 정원산업전, 학술행사, 문화프로그램 운영
- 사업예산 : 2,933백만원('24년 추경 910, '25년 2,023)




□ 진행상황

- 행사 개최 **72일만에** 누적 관람객 수 **500만명** 달성
- 전년 동기 대비 보라매공원 방문객 수 3.3배 증가
- 야간조명, 쿨링포그, 무더위 쉼터 지정 등으로 **여름밤 이용자 수 증가**
- 7월 이용자 중 19~22시 이용자가 전체의 27%를 차지

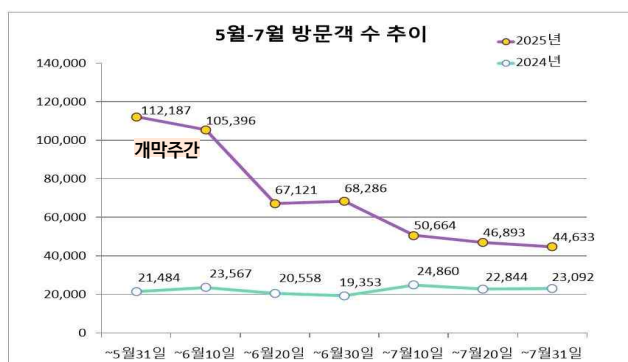

< '24년 대비 '25년 보라매공원 방문객 추이>

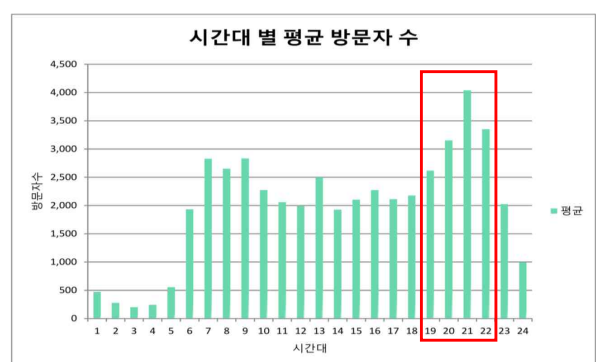

<7월 시간대별 방문객 수>

○ 매력과 스토리가 있는 다채로운 111개의 정원 조성

- 작가정원(7개소) : 국내·외 초청작가(2팀), 국제공모 선정 작가(국내 3팀, 해외 2팀) 참여
- 작품정원(33개소) : ESG 경영 연계 기업·기관 정원 조성 및 프로그램 참여
- 동행정원(62개소) : 학생, 시민, 다문화가족 등 다양한 이웃 참여형 정원 조성
- 매력정원(9개소) : 서울의 다양한 매력과 이야기를 담은 서울이야기정원 등



< 작가정원 >



< 기업정원-KB증권 >



< 시민동행정원 >

○ '정원도시 서울'을 Fun하게 즐길 수 있는 정원문화프로그램(63개) 운영

- 정원 속 가드닝 체험, 정원작은음악회, 테라리움 전시, 도슨트 투어 등
 - 장애인·어르신 대상 약자 동행 프로그램, 정원치유 및 처방 프로그램 등
 - 외국인 대상 정원 산책, 전통차 마시기, 여행하는 돌 그리기 등 전통 문화 체험 프로그램
- ※ '정원도시 서울 2주년 토크콘서트'(5.24.)를 통해 '정원도시 서울' 정책 방향 논의

○ 정원 트렌드를 반영한 정원산업전, 푸드트럭, 직거래장터 등 운영


- 정원식물, 정원용품, 조명, 캠핑, 아웃도어 등 정원산업의 최신 트렌드 체험 기회 제공
- 소상공인 연계 푸드트럭, 도농상생 직거래 서로장터, 장애인 생상품 판매 행복장터 등 운영

○ 지역 경제 활성화를 위한 인근 자치구 및 상권 연계 할인 이벤트 추진

- '가든 스탬프 투어' 참여 관람객 대상, 동작·관악구 상점 할인 혜택 부여
- 박람회 기간 중 동작사랑상품권 10% 할인 특별 발행(6월)



< 정원 작은음악회 >



< 무더위 특별프로그램 >



< 서로장터 >

□ 추진일정

- 행사 개최 : '25. 5. ~ 10.
- 박람회 학술행사(국제정원심포지엄) 개최 : '25. 10.
- 행사결과 정리 및 백서 발행 : '25. 11. ~ 12.

1-3 거점형 특화공원 조성

공원조성과장 : 박미애 ☎2133-2050 공원개발팀장 : 최정희 ☎2059 담당 : 이은국 ☎2061
 생활공원팀장 : 심현보 ☎2066 담당 : 채희선 ☎2067
 주재공원팀장 : 장창수 ☎2073 담당 : 김재희 ☎2075
 북부공원여가센터소장 : 박철수 ☎2289-4010 조경지원과장 : 송형중 ☎4080 담당 : 윤보람 ☎4082

시민들이 다채롭게 즐길 수 있는 특화된 거점형 공원을 권역별로 조성하여
 지역별 균형 있는 공원 서비스 제공

① (서남권) 국회대로 상부공원 · 여의도공원 조성

국회대로 상부공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로(7.6km 구간)
- 기 간 : '15년 ~ '30년
- 총사업비 : 108,800백만원(예산편성부서: 도로계획과)
- 주요내용 : 가로숲 및 지하차도 상부 공원 조성
 - (1단계) 도로다이어트(8→6차로) 가로숲 1.6만㎡ / (2단계) 지하차도 상부 공원 8.7만㎡

□ 추진실적 및 향후계획

- 상부 공원 구간 설계 준공 : '24. 9.
- (1단계) 도로다이어트 구간 가로숲 조성 추진 : ~ '26. 6.
- (2단계) 지하차도 상부 공원 조성 추진 : ~ '30. 12.
- ※ 지하차도 전 구간 개통 이후 공원 조성

여의도공원 재조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도동2(222,539㎡) ※ 샛강 수변 약 27,000㎡ 포함
- 기 간 : '25년 ~ '30년
- 총사업비 : 53,100백만원 ※ '25년 예산 : 300백만원(설계공모비)
- 주요내용 : 도심 문화공원으로 재조성, 샛강 생태공원과 연결동선 마련 등

□ 추진실적 및 향후계획

- 설계공모 및 설계용역 : '25. ~ '26.
- 단계별 공사 추진 : '27. ~ '30.

② (서북권) 백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성

□ 사업개요


- 위 치 : 서대문구 홍은동 및 은평구 응암동 일대(527,838㎡)
- 기 간 : '22년 ~ '26년
- 총사업비 : 14,400백만원 ※ '25년 예산 : 3,108백만원(서대문 1,323, 은평 1,785)
- 내 용 : 특화거점 및 특화시설 도입을 통해 도시숲 체험형 복합 힐링공간 조성
 - [특화거점] 놀자숲(숲놀이터), 백련활력마당(운동공간), 숲정이(여가공간)
 - [특화시설] 산림치유센터(서대문구), 은평정(은평구 전망대)



<서대문구 놀자숲>



<서대문구 백련활력마당>



<은평구 꿈마을 숲정이>

□ 추진실적 및 향후계획

- 놀자숲, 숲정이 설계 완료 : '24. 12.
- 설계(백련활력마당, 산림치유센터, 은평정), 공사(놀자숲, 숲정이) : '25. 1. ~ 12.


③ (동북권) 서울창포원 정비

□ 사업개요


- 위 치 : 도봉구 도봉동 마들로 916(51,146㎡)
- 기 간 : '24. 7. ~ '25. 12.
- 총사업비 : 3,400백만원 ※ '25년 예산 : 2,100백만원(국비 1400, 시비 700)
- 주요내용 : 생태경관 제고와 시민이용 활성화를 위한 매력정원 등 조성·정비

□ 추진실적 및 향후계획


- (1단계) 플라워가든, 맨발건강길, 발물놀이터 및 모래체험장 조성 등 : '24. 9.~'25. 5.
- (2단계) 바닥분수·물놀이장, 매력정원, 습지원 정비, 조명설치 등 : '25. 1. ~ 8.



<바닥분수·물놀이장>



<매력정원 조성>



<습지원 조성>

④ (동남권) 암사역사공원 · 말죽거리근린공원 조성

암사역사공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 강동구 암사동 211-1번지 일대(110,198㎡)
- 기 간 : '04년 ~ '26년
- 총사업비 : 141,939백만원 ※ '25년 예산: 24,390백만원(공공시설 설치기금 22,950, 이월 1,440)
- 주요내용 : 토지보상 및 역사 테마공원 조성

□ 추진실적 및 향후계획

- 기본계획 용역 : '24. 5. ~ '25. 3.
- 문화유산 시굴조사 및 정밀발굴조사 : '24.10. ~ '25.12.
- 토지보상 및 공원조성 : '25. 1. ~ '26.12.

말죽거리근린공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 서초구 양재동 산20-2 일대(132,020㎡)
- 기 간 : '21년 ~ '25년
- 총사업비 : 10,416백만원 ※ '25년 예산 : 7,159백만원(본예산 5,226, 이월 1,933)
- 주요내용 : 숲 테마정원 조성, 복합문화시설 건립 등

□ 추진실적 및 향후계획

- 1·2단계(토목·건축) 공사 시행 : '24. 1. ~ '25. 6.
- 3단계(조경) 공사 시행 및 준공 : '25. 1. ~ '25. 12.



<암사역사공원 조감도>



<암사역사공원 입구 광장 벽천(안)>



<말죽거리근린공원 조감도>

1-4 생활밀착형 공원 조성 및 지속적인 공원용지 확보

공원조성과장 : 박미애 ☎2133-2050 생활공원팀장 : 심현보 ☎2066 담당 : 채희선 ☎2070
주제공원팀장 : 장창수 ☎2073 담당 : 김재희 ☎2075
공원구역팀장 : 함희진 ☎2082 담당 : 이미라 ☎2085

현세대와 미래세대를 위해 재정·비재정 등 다양한 방안으로 공원녹지를 확보하여, 계절별 특색있는 다채로운 생활밀착형 공원(정원) 조성

① 생활권 주변에서 누리는 **공원 · 정원 확대**

□ 사업개요

- 대 상 지 : 약 80만㎡('19년 이후 보상지 중 미 조성된 시 공원)
- 기 간 : '21년 ~ '26년
- 주요내용 : 매력가든 및 쉼터 조성, 훼손지 복원, 건물(지장물) 철거 등
- 총사업비 : 762억원('25년 예산 7,488백만원)


구 분	합 계	연차별 계획					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
조 성(개소)	105	13	14	23	22	14	19
면 적(만㎡)	80	8	15	26	13	9	9
소요예산(억원)	762	85	117	218	157	75	110

□ 추진실적


- ('21년~'24년) 72개소(62만㎡) 중 60개소(53만㎡) 완료 ※ '24년 12개소는 이월
- ('25년) 관악구 관악산근린공원 등 14개소(9만㎡) 추진중(1개소 완료)
 - 설계 용역중(7개소), 공사중(6개소), 공사 완료(1개소, 광진 용마산근린공원)

□ 향후계획

- 기본계획 및 실시설계, 사전절차 이행, 공사 시행·준공 : ~ '25. 12.



<노원구 초안산근린공원('24년)>



<관악구 관악산근린공원('24년)>

② 재정 및 비재정 방안을 통한 공원용지 적극 확보

□ 사업개요

- 대 상 지 : 도시공원 13.64km²(도시자연공원구역 6.3km² + 시설공원 7.34km²)
- 기 간 : '02년 ~ '30년
- 주요내용 : (재정) 도시공원 협의매수(매수청구), 보상, (비재정) 부지사용계약 등
- 총사업비 : 도시자연공원구역 협의매수 2조 2,801억원
장기미집행 도시공원 보상 3조 7,205억원
 - ('25년 예산) 도시자연공원구역 사유지 협의매수(48억원), 장기미집행도시공원 보상(91억원), 도시자연공원구역 사유지 매수청구(50억원)

□ 추진실적

- 도시자연공원구역 사유지 협의매수 지속 추진
 - 주요 산책로 등 시민 이용이 많은 토지부터 단계적 매수 추진
 - '25년 총 13필지(23,360m²) 협의매수 추진 ※ 감정평가 진행 중('25.7월말)
- 장기미집행 도시계획시설(공원) 보상 신속 마무리
 - '25년 잔여 대상지 0.1km² 보상 추진 중 ※ 전체 7.34km² 중 7.24km²(98.6%) 보상완료('25.7월말)
 - 잔여지 보상이 조속히 완료되도록 보상 적극 추진
- 도시자연공원구역 사유지 매수청구 추진
 - '25년 총 10필지(1,813.8m²) 매수청구 추진 중 ※ 감정평가 완료 4필지, 추가매수 6필지('25.7월말)
 - 관련 법령에 따라 매수대상 판정기준에 적합할 경우 법정기간 내 의무매수
※ 매수 청구인에게 매수결정 통보한 날부터 3년 이내 매수
- (비재정) 부지사용계약(무상)을 통한 공원용지 확보로 시민이용공간 제공
 - 도시공원 내 사유지 중 보상이나 매수가 어려운 학교·종중·법인·개인 소유 토지에 부지사용계약 등 체결(보상비 절감, 지방세 감면 혜택)
※ 37개 공원·구역 144필지, 735,310m² 계약 체결('25.7월 말 기준)

□ 향후계획

- 장기미집행 도시공원 잔여지 및 공원구역 협의매수(매수청구) 보상 추진 : ~ '25. 12.

1-5 도심 내 역사·녹지공간 조성

정원도시정책과장: 안수연 ☎2133-2010 공원녹지기획팀장: 구동근 ☎2021 담당: 이진범 ☎2022
 공원조성과장: 박미애 ☎2133-2050 생활공원팀장: 심현보 ☎2066 담당: 김정주 ☎2068
 조경과장: 온수진 ☎2133-2101 조경시설팀장: 정지윤 ☎2115 담당: 윤중국·최배근·한지연 ☎2118
 서울정원팀장: 한봉기 ☎2108 담당: 이영선 ☎2124

도심 내 역사와 녹지공간을 조성하여 역사·문화적 가치를 보존하고, 도시 경관을 개선하며, 시민의 휴식·이용 공간 확충

① 월드컵공원 사면 경관숲 조성

□ 사업개요

- 대상지 : 하늘·노을공원 사면부(전체 사면 113만㎡ 중 남사면 41만㎡)
- 사업기간 : '24. 10. ~ '26. 12.
- 총사업비 : 9,960백만원 ('24년 3,460, '25년 4,000, '26년 2,500)
- 사업내용 : 꽃과 열매가 있는 다채로운 숲으로 조성하여 자연성 강화 및 경관 개선

□ 추진실적


- '25. 4. 26. 시민참여 나무심기(가톨릭교구·노을공원시민모임, 산수유 300주 식재)
- '25. 4. 30. 관문녹지 개선(노을공원 1km, 화관목 25천주 식재) 완료
- '25. 5. 19. 시민참여 식재 추진 협력단체(노을공원시민모임) 협약
- '25. 6. 28. 시민참여 가든커넥터(하늘공원 224㎡, 100개소) 조성



<총괄 계획도>



<시민참여 나무심기>



<관문녹지, 노을공원>

□ 향후계획

- 하늘·노을공원 주요동선 선형정원(가든커넥터) 조성(면적:4,000㎡) : '25. 3. ~ 11.
- 시민참여 나무심기(1만4천주) 및 관리 프로그램 운영 : '25. 6. ~ 12.
- 월드컵공원 사면 경관숲(하늘공원, 노을공원) 조성 : '25. 6. ~ '26. 12.
- 시민참여 가든커넥터 조성(노을공원 600㎡) : '25. 8. ~ 11.
- 하늘공원 Z형 계단 설치 및 전망공간 준공 : '25. 10.

② 경희궁지 일대 녹지공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 경희궁지 (종로구 신문로2가 2-1 일대)
- 기 간 : '24. 1. ~ '25. 12.
- 총사업비 : 2,510백만원 ('24년 1,055, '25년 1,455)
- 주요내용 : 궁궐(역사)정원 조성, 기후 환경숲 조성, 주변 녹지네트워크 강화 등

□ 주요내용

- (1단계) 경희궁지 전면부 정비 ('24. 10. ~ '25. 5.)
 - 진입부에 전통수종 식재, 궁궐(역사)정원 특화 조성으로 입구성 제고
 - 노후 시설 정비로 쾌적한 공원 환경 제공 및 경희궁 경관 향상
- (2단계) 경희궁지 후면부 정비 ('25. 2. ~ 12.)
 - 새문안로 가로정원(동행·매력가든) 조성하여 가든 커넥터 완성
 - 시민 이용 산책로 정비 및 기후 환경숲 조성, 주민 편의공간 정비

□ 추진실적

- (1단계) 경희궁지 전면부 정비
 - 추진계획 수립, 문화재 현상 변경심의 및 설계용역, 착공 : '24. 2. ~ 10.
 - 공사 시행 및 준공 : '24.10. ~ '25. 5.
- (2단계) 경희궁지 후면부 정비
 - 추진계획 수립, 실시 설계 용역 발주 : '25. 2.
 - 설계 용역 및 문화재 현상 변경 심의 : '25. 3. ~ 7.

□ 향후계획

- (2단계) 공사 시행(기후환경숲 조성, 새문안로 가로정원 조성사업) : '25. 8. ~ 12.



<경희궁 진입부 바닥정비>



<경희궁 전면부 잔디식재>



<경희궁 후면부 조성안>

③ 서울광장숲 조성

□ 사업개요

- 대 상 : 중구 세종대로 110(서울광장)
- 기 간 : '23. ~ '26.
- 내 용 : 서울광장 수목 식재, 그늘목 플랜터 등 휴게시설 조성
- 총사업비 : 7,225백만원 (1단계 1,888, 2단계 5,337)
※ '25년 예산 5,337백만원('24년 사고 74, 명시 2,263, '25년 본예산 3,000)

□ 추진현황

- 서울 광장숲 조성 단계별 추진계획(부시장방침 제10호) : '23. 1. 13.
- 1단계 설계(문화재조사), 1단계 공사 시행 : '23. 2. ~ 11.
- 2단계 기본 및 실시설계 착수(제안서평가, 계약 등) : '23. 7. ~ 10.
- 자문단 구성, 관련부서 협의, 총괄건축가 자문 실시 : '24. 1. ~ 10.
- 시장보고, 문화유산 조사, 기술심의 등 사전절차 추진 : '24. 11. ~ '25. 2.
- 2단계 1차 공사 : '25. 2. ~ 4.
 - 잔디광장 패턴화, 그늘목 플랜터(서측) 설치 등

□ 향후계획

- 2단계 2차 공사 시행 및 준공 : '25. 11.~ '26. 4.
 - 바닥 포장 교체, 그늘목 플랜터(동측) 설치 및 앗음벽 조성 등



< 평면도 >



< 조감도 >



< 2단계 1차 공사 후 >

④ 환구단 정문 열린정원 조성

□ 사업개요

- 대 상 지 : 환구단 정문 일대(중구 소공동 97-3 등 3필지)
- 규 모 : 666.2㎡
- 기 간 : '23. 11. ~ '25. 5.
- 내 용 : 펜스 및 담장 철거, 정원조성, 경관조명 설치 등
- 사업예산 : 483백만원

□ 추진실적

- (1단계) 환구단 정문 경계 펜스 철거 완료 ('23. 11. ~ 12.)
 - 경계 정비 계획 수립 ('23.11. / 市 미래공간기획관)
 - 경계 펜스 철거를 통한 시인성 확보
 - (2단계) 환구단 정문 열린정원 조성 완료 ('24. 1. ~ '25. 5.)
 - '24년 : 실시설계용역, 문화재 현상변경 심의 등 사전절차 이행
 - '25년 : 매장유산 시굴조사, 열린정원 조성사업 시행·완료
- ※ 담장 철거 및 바닥 포장 정비, 무장애 램프 및 전통정원 조성, 야간조명 설치 등

□ 향후계획

- 시설 유지관리 (市 문화유산보존과 및 중구청 건축과) : '25. 5. ~



< 조성 전 >



< 조성 후 >

⑤ 고가하부 그린아트길 조성

□ 사업개요

- 대 상 지 : 영등포구 당산역 고가하부 등 6개소(11,815㎡)
 - '25년 신규(2) : 영등포(당산역), 서대문(남가좌동 내부순환도로)
 - '24년 이월(4) : 강서(가양대교), 성북(석계역, 정릉동 내부순환도로), 노원(노원역)
- 기 간 : '25. 1. ~ 11.
- 내 용 : 고가 하부 유휴공간 내 정원 조성 등
- 사업예산 : 3,282백만원('24년 이월 2,382, '25년 900)

□ 추진실적 및 향후계획

- 4개소(가양대교, 석계역, 정릉동 내부순환도로, 노원역) 조성 완료 : '25. 7.
- 2개소(당산역, 남가좌동 내부순환도로) 공사 시행 및 준공 : '25. 8. ~ 11.

⑥ 서울 아래숲길 조성

□ 사업개요

- 대 상 지 : 지하철 7호선 보라매역(지하1층 / 300㎡)
- 기 간 : '25. 1. ~ 10.
- 내 용 : 목재 활용 탄소저감 쉼터, 보라매 역사 아카이브 활용 녹화, 보라매 국제정원박람회 홍보를 위한 포토존, 보라계열 식재 등
- 사업예산 : 300백만원

□ 추진실적 및 향후계획


- 보라매역 아래숲길 조성 : '25. 1. ~ 5.
- 유지관리 용역 시행 ※ 용역 종료 후 직영 인력 활용 지속 관리 예정 : '25. 5. ~ 10.



<가양대교 그린아트길(강서)>



<내부순환로 그린아트길(성북)>



<보라매역 아래숲길 전경>



<보라매 역사 아카이브>

1-6


단절된 남산, 관악산 녹지축 연결 추진

자연생태과장 : 이창훈 ☎2133-2141 자연생태기획팀장 : 조진성 ☎2164 담당 : 강명환 ☎2154


도로개설 등으로 인해 단절된 공원·녹지를 연결하여 그린네트워크를 구축하고 시민들의 편익 증진 및 생물종 다양성 증진에 기여

□ 사업개요

- 대 상 지 : 남산 장충단고개(중구), 관악산 관악로·호암로(관악구)
- 사업기간 : '25. 1. ~ '27. 12.
- 총사업비 : 12,877백만원(남산 6,225백만원, 관악산(2개소) 6,652백만원)
 - '25년 예산 : 용역비 350백만원(남산 50백만원, 관악산 300백만원)
- 사업내용 : 남산, 관악산의 단절된 녹지축을 연결하는 녹지연결로 조성

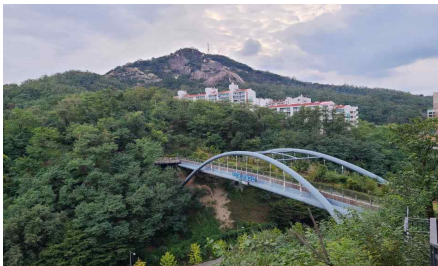

<서대문구 무악재 녹지연결로('17)>

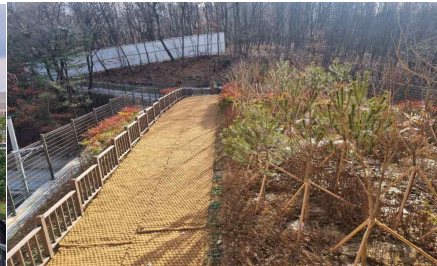

<강동구 샘터길 녹지연결로('24)>



<남산 장충단고개 녹지연결로 조감도>

□ 추진실적

- (남산 장충단고개) 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진 완료 : '25. 1. ~ 6.
- (관악산 관악로·호암로) 기본 및 실시설계 용역 추진 중 : '25. 1. ~ 12.

□ 향후계획

- 남산 장충단고개
 - 市 투자심사 : '25. 10.
 - 기본 및 실시설계 용역 : '26. 1. ~ 10.
 - 공사발주 및 시행 : '26. 11. ~ '27. 12.
- 관악산 관악로·호암로
 - 기본 및 실시설계 용역 준공 : '25. 12.
 - 공사발주 및 시행 : '26. 1. ~ 12.

2. 정원이 건네는 휴식, 정원 문화 확산

2-1. 정원 · 치유여가 프로그램 운영

2-2. 숲과 산이 어우러진 도심 속 휴식공간 조성

2-3. 남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성

2-4. 모두가 즐기는 자연 속 놀이 · 체험공간 조성



2-1

정원 · 치유여가 프로그램 운영

공원여가사업과장:정명이 ☎2133-9356 공원여가운영팀장:이보현 ☎9364 담당 : 고민언·김정환 ☎9367
산림여가운영팀장:임록화 ☎9368 담당 : 김봉선·정다미 ☎9369

일상 속 정원문화 확산을 위해 '정원을 여가로, 정원에서 치유를' 즐길 수 있는
「정원·치유여가 프로그램」 추진

① 어딜가든 가드닝, 정원여가 프로그램

□ 사업개요

○ 주요내용

- 정원여가 프로그램 운영 및 정보제공 거점 공간인 정원문화힐링센터(4개소) 확충
- 정원여가 활동 활성화를 위해 대상별 특성에 맞춘 가드닝 클래스 운영(250회)

○ 사업예산 : 360백만원

□ 추진실적 : 129회 1,798명 참여('25. 7월 기준)

정원문화힐링센터 (가드닝라운지)	▶ 남산서울타워 「서울 정원문화힐링센터(가드닝라운지)」 운영(3월~) ▶ 운영실적 : 84회 858명 참여(손바닥정원·씨앗공 만들기,판화,새산책 등) ※ 여가센터별 3개소 확충[북서울꿈의숲(4월), 보라매공원(5월), 월드컵공원(9월)]
청년 가드닝 (가드닝 클럽)	▶ 청년들과 함께 가드닝 기초부터 실습까지 공유정원 조성 및 관리 체험 ▶ 운영실적 : 6회 242명 참여
어르신 가드닝 (슬로우 가드닝)	▶ 노인복지시설 이용 어르신 대상 정원체험 및 가드닝 수업 운영 ▶ 운영실적 : 21회 485명 참여
직장인 가드닝 (퇴근 후 정원생활)	▶ 퇴근 후 도심 속 일상 공간에서 직장인 대상 가드닝 체험 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 15회 171명 참여
어린이 가드닝 (해치의 여름정원학교)	▶ 초등학생 동반 가족 대상 여름방학 맞춤형 가드닝 체험 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 3회 42명 참여 ※ 8월 중 6회, 69명 참여 예정

□ 향후계획

- 정원문화힐링센터 운영(41회) : ~ '25. 12.
- 청년·어르신·직장인 대상 가드닝 클래스 운영(81회) : ~ '25. 12.
- 정원여가 심포지엄 개최(보라매공원 청소년센터 대강당) : '25. 9. 18.

② 숲과 산림에서 즐기는 치유여가 프로그램

□ 사업개요

- 대 상 지 : 녹색복지센터, 치유의숲길, 유아숲체험원, 목재문화체험장 등
- 기 간 : '25. 3. ~ 12.
- 내 용 : 산림자원 등을 활용한 치유 및 여가 프로그램 운영
 - (산림여가) 숲과 산림을 활용한 심신 휴식, 자연 체험 및 창작활동 지원
 - (정원처방) 정원과 산림자원을 활용한 정원·원예·산림치유 요소 통합
- 사업예산 : 5,811백만원(국비 1,575백만원, 시비 4,236백만원)

□ 추진실적 : 19,947회 470,463명 참여(서울형 정원처방 1,760회 29,036명, '25. 7월 기준)

녹색복지센터 (3개소)	▶ 불암·우장·아차산에서 생애주기별 맞춤 치유 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 1,236회 20,009명 참여(서울형 정원처방 142회 1,422명)
치유의숲길 (17개소)	▶ 산림치유지도사 채용하여 숲길 기반의 치유 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 1,745회 12,032명 참여(서울형 정원처방 193회 1,960명)
유아숲체험원 (75개소)	▶ 유아가 자연을 체험하고 학습 할 수 있도록 유아숲지도사 채용하여 운영 ▶ 운영실적 : 12,477회 373,426명 참여(서울형 정원처방 1,096회 21,552명)
목재문화체험장 (17개소)	▶ 우수한 역량을 지닌 목공지도사가 생활속 목공체험 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 1,375회 14,024명 참여(서울형 정원처방 94회 926명) ※ '25년 목재문화페스티벌('25.6.14.~15.) : 약 7,000명 참여(보라매공원)
숲해설 (29개소)	▶ 숲해설가 통한 숲에 대한 지식 전달 및 자연과 교감 하는 프로그램 운영 ▶ 운영실적 : 3,114회 50,972명 참여(서울형 정원처방 235회 3,176명)

□ 향후계획

- 서울형 정원처방 매뉴얼 개발 : '25. 3. ~ 11.
- '25년 유아숲 가족축제 개최 : '25. 9. ~ 10.
- 서울형 정원처방 운영자 대상 매뉴얼 교육 : '25. 12.

2-2

숲과 산이 어우러진 도심 속 휴식공간 조성

자연생태과장 : 이창훈 ☎2133-2141

자연생태기획팀장 : 조진성 ☎2164

담당: 강명환 · 유진아 ☎2154 · 2155

도심 속 시민이 머물며 즐길 수 있는 산림 휴양 인프라를 조성하여 시민의 건강 증진 및 건전한 여가 문화 조성

① 서울둘레길 거점형 산림휴양시설

□ 사업개요

- 대 상 지 : 용마산(동북권), 호암산(서남권), 우면산(동남권), 봉산(서북권)
- 기 간 : '23. 7. ~ '26. 12.
- 내 용 : 권역별 산림휴양시설 조성(하늘숲길, 하늘전망대, 트리하우스 등)
- 총사업비 : 9,266백만원
 - '25년 예산 : 4,476백만원(본예산 999, 추경예산 170, 이월예산 3,307)



< 용마산 조감도 >



< 호암산 조감도 >

□ 추진실적

- 용마산 거점형 산림휴양시설 : 하늘숲길(약160m), 하늘전망대, 무인휴게소 등
 - 기본 및 실시설계용역, 관계기관 협의, 자문 등 : '23. 9. ~ '24. 10.
 - 공사시행 : '25. 1. ~
- 호암산 거점형 산림휴양시설 : 무장애데크길(약270m), 하늘쉼터(전망대) 등
 - 기본 및 실시설계 용역 준공 : '25. 4.
 - 공사시행 : '25. 5. ~

□ 향후계획

- 용마산·호암산 공사준공 : '25. 10. ~ 12.
- 우면산·봉산 실시설계 및 공사시행 : '26. 1. ~ 12.

② 관악산 자연휴양림

□ 사업개요

- 대 상 지 : 관악구 신림동 산 117-25 일대(관악산 선우지구 일대)
- 기 간 : '24. 6. ~ '27. 5.
- 규 모 : 216,333㎡(국유지 204,168, 시유지 12,165)
- 내 용 : 숙박 및 편의시설, 체험형 숲 정원 조성 등
- 총사업비 : 14,731백만원(시비 12,942, 구비 1,789)



< 휴양림 전경 >



< 숙박시설 트리하우스 >

□ 추진실적

- 자연휴양림 조성 관련 협의(관악구, 산림청) : '23. 10. ~ '24. 2.
- 타당성 평가 및 사전입지조사서 작성 용역 : '24. 9. ~ '25. 2.
- 기본계획 용역 : '24. 12. ~ '25. 8.
- 관악산 자연휴양림 지정 고시(산림청) : '25. 5. 13.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 : '25. 9. ~ '26. 3.
 - 자연휴양림 조성계획 수립
 - ※ 자연휴양림 조성계획 신청 전 사전재해영향성검토, 환경영향평가, 신재생에너지 반영 여부 검토, 산지 전용 및 국유림 사용 허가 등 사전절차 이행
- 공사 시행 및 개장 : '26. 4. ~ '27. 5.

2-3

남산의 자연과 문화를 담은 숲공간 조성

자연생태과장 : 이창훈 ☎2133-2141 자연생태기획팀장 : 조진성 ☎2164 담당 : 유진이 ☎2155

남산에 도심 조망 및 숲체험이 가능한 '하늘숲길', 자연과 문화를 담은 '한국숲정원'을 조성하여 시민들에게 도심 속 숲 여행의 즐거움 제공

① 남산 하늘숲길 조성

□ 사업개요

- 대 상 : 용산구 후암동 산1-2 일대(남산 체력단련장 ~ 남산도서관)
- 기 간 : '23. 6. ~ '25. 9.
- 내 용 : 무장애숲길(1.43km), 조망명소 및 매력공간 조성
- 사업예산 : 3,895백만원(설계용역비 126, 공사비 3,769)

□ 추진일정

- 기본 및 실시설계용역 : '24. 9. ~ '25. 2.
- 공사 착공 및 준공 : '25. 3. ~ 9. ※시민개방(10월)

② 남산 한국숲정원 조성

□ 사업개요

- 대 상 : 용산구 이태원동 259-15(남산 야외식물원 일대)
- 기 간 : '23. 6. ~ '25. 12.
- 내 용 : 남산의 숲을 배경으로 한국의 자연과 문화, 사람의 이야기를 담은 '한국숲정원' 조성
- 사업예산 : 3,133백만원(용역비 213, 공사 2,920)

□ 추진일정

- 기본 및 실시설계 용역 : '24. 12. ~ '25. 4.
- 공사 발주, 착공 및 준공 : '25. 5. ~ 12.



<하늘숲길_무장애숲길>



<하늘숲길_계곡전망다리>



<한국숲정원_솔숲마당>



<한국숲정원_이끼원>

2-4 모두가 즐기는 자연 속 놀이·체험공간 조성

정원도시정책과장: 안수연 ☎2133-2010 공원녹지협력팀장: 신보식 ☎2039 담당: 김윤미 ☎2020
 공원조성과장: 박미애 ☎2133-2050 공원개발팀장: 최정희 ☎2059 담당: 윤여길 ☎2063
 자연생태과장: 이창훈 ☎2133-2141 자연생태기획팀장: 조진성 ☎2164 담당: 김진명 ☎2152

아이들과 가족, 시민들이 자연 속에서 놀이와 체험, 교육을 동시에 즐길 수 있도록 휴식공간을 다채롭게 조성하여 건강한 여가문화를 확산

① 어린이 모두에게 재미있는 놀이공간 - 권역별 거점형 어린이놀이터 조성

- 추진내용 : 권역별 거점공원 내 유니버설디자인의 놀이공간 조성('26년까지 5개소)
- 총사업비 : 9,000백만원 ※ '25년 예산 1,817백만원(본예산 1,256, 이월 561)
- 추진실적
 - 개 장(2개소) : 광나루한강공원(6천㎡, '22년), 보라매공원(1만5천㎡, '24년)
 - 추진중(2개소) : 북서울꿈의숲(공사), 용산가족공원(설계)
- 추진일정(안)
 - 북서울꿈의숲(동북권) 거점형 어린이놀이터 개장 : '25. 10.
 - 용산가족공원(도심권) 거점형 어린이놀이터 설계 준공 : '25. 11.

② 사계절 가족 단위 새로운 놀이여가시설 - 실내놀이터 조성

- 추진내용 : 어린이 놀이·돌봄, 보호자 여가가 가능한 복합문화공간 조성
- 총사업비 : 34,806백만원 ※ '25년 예산 2,701백만원(본예산 2,517, 추경 150, 이월 34), 특별조정교부금 11,000백만원(이월)
- 추진실적
 - 개 관(8개소) : 벌집(성북), 중평(노원), 오목(양천), 보라매공원(동작), 신트리(양천) 등
 - 추진중(10개소) : 둘리쌍문(도봉)·심청(종로)·천왕(구로)·새샘(동대문) 등(계획·설계 5, 공사 5)
- 추진일정(안)
 - '25. 준공예정 : 새샘(동대문/9월), 강월(양천/11월), 쌍룡산(마포/11월), 둘리쌍문(도봉/12월)



<거점형놀이터 조성계획안(북서울꿈의숲)> <거점형놀이터 조성계획안(용산가족공원)> <실내놀이터 조성계획안(새샘근린공원)>

③ 자연에서 배우고 즐기는 - 유아숲체험시설 조성

- 추진내용 : 유아숲체험원, 엄마아빠VIP존 등 조성
- 총사업비 : 3,729백만원 (본예산 3,314, 이월 415)
- 추진계획 : 관악 청룡산지구 유아숲체험원(청룡동 산175-36) 등 10개소 조성
 - 신 규(2개소) : ('24년) 강서 궁산 / ('25년) 강동 일자산
 - 재정비(8개소) : ('25년) 관악 낙성대·선우지구·청룡산지구, 노원 수락산, 동대문 답십리 근린공원, 성동 대현산·금호산, 영등포 영등포공원
- 추진일정
 - 유아숲체험원(궁산) 준공 : '25. 5.
 - 유아숲체험원(청룡산지구 등 9개소) 준공 : '25. 9. ~ 12.



<강서 궁산 유아숲체험원 조성>



<관악 청룡산지구 유아숲체험원 재정비>



<노원 수락산 유아숲체험원 재정비>

④ 공원 내 책쉼터 조성

- 추진내용 : 북카페, 이야기 정원 등 공원 내 힐링 복합여가공간 조성
- 총사업비 : 37,200백만원 ※ '25년 예산 : 4,278백만원(본예산 3,850, 이월 428)
- 추진실적 : 10개소 개관('20 ~ '24.), 4개소 공사 및 설계 추진('25.1. ~5.)
 - 개 관(10개소) : 응봉(성동), 들리쌍문(도봉), 오동(성북), 대현산응봉(성동), 용마산(광진), 율현(강남), 봉제산(강서), 양천(양천), 천왕산(구로), 상암(마포)
 - 추진중(4개소) : 용마산(공사 계약심사 완료), 개운산·대모산·봉산(설계 추진중)
- 향후계획
 - 기본 및 실시설계 준공 : 개운산('25.10.), 대모산('25.10.), 봉산('26.4.)
 - 공사착공 : 용마산('25.8.), 개운산('25.11.), 대모산('25.11.)



<율현(강남) 책쉼터>



<상암(마포) 책쉼터>



<개운산(성북) 책쉼터>

3. 안전하고 건강한 숲 · 공원 관리 · 운영

3-1. 안전한 산림 관리를 위한 산불방지 대책

3-2. 풍수해 대비 산사태 예방대책 추진



3-1

안전한 산림 관리를 위한 산불방지 대책

자연생태과장 : 이창훈 ☎2133-2141 산림관리팀장 : 김방용 ☎2147 담당 : 김영미 ☎2160

「산림보호법」 제29조에 따라, 우리 시 산불발생 요인을 사전에 차단하고
산불 피해를 최소화하기 위해 통합적인 산불감시 및 대응체계 구축·운영

□ 사업개요

- 대 상 : 산림 15,335만㎡
 - 기 간 : '25. 1. ~ 12.
 - 내 용 : 산불 예방·감시, 대비, 진화, 피해조사 등 추진
 - 사업예산 : 1,443백만원(국비 551, 시비 892)
- ※ '25.7월 기준 산불발생 현황 : 4건(온수도시공원 등 피해 면적 5,900㎡)

□ 추진실적

- (예방·감시) **산불 요인 차단**을 위한 감시 체계 강화 및 홍보 활동
 - 블랙박스('25년 275대 신설, 총 491대), 조망형 산불무인감시카메라(43대) 운영 등
 - AI기반 산불감시 ICT플랫폼 구축('25년 2대 신설, 총 4대) → 조기 감지 및 초동대응 강화
 - 산불예방 캠페인(과태료 부과 안내) 및 공익광고 영상 표출(지하철, 옥외전광판 등)
- (대비) **유관기관 협력체계 강화 및 진화인력 역량 제고로 신속한 대응**
 - 산불방지협의회 운영(10개 기관 참여), 봄·가을철 산불방지대책본부 운영
 - 산불전문예방진화대원(130명) 및 산불감시보조인력(132명) 교육·훈련
 - 기관별 공무원진화대 24개 기관, 약 3,600여명(기관별 약 150명)
- (진화) **진화 역량 강화와 권역별 대응 체계 구축으로 효과적 진화**
 - 드론(에어로졸 8kg, 진화면적 10㎡)을 활용한 산불 진화(119특수구조대 협조)
 - 유관기관 산불진화헬기 29대 공조(서울소방본부 3, 서울산림항공 3, 서울경찰청 1, 소방청 2, 합참 2, 경기도 18)
 - 5개 권역별 인력 및 장비 지원 체계 마련 → 산불 확산 시 즉시 대응
- (피해조사) **산불 원인 규명 및 책임자 추적을 통한 재발 방지**
 - 산불방지 위반 신고 포상금 제도 활성화 ※ 포상금 최대 300만원
 - 산불전문조사반 구성·운영(국립산림과학원, 경찰 등 관련분야 전문가 포함 6명)
 - 경찰과 협력체계 구축하여 가해자 검거 및 구상권 청구 등

□ 향후계획

- 유관기관 합동 산불진화 훈련 : '25. 10.
- 가을철 산불방지대책본부 운영 : '25. 11. 1. ~ 12. 15.(45일간)

3-2 풍수해 대비 산사태 예방대책 추진

산지방재과장 : 유양현 ☎2133-2170 사면총괄팀장 : 최석환 ☎2172 담당 : 허향미 ☎2173
 사면관리팀장 : 손병도 ☎2187 담당 : 안태경 ☎2181
 사면관리팀장 : 이동욱 ☎2184 담당 : 최서영 ☎2183

폭우·태풍 등으로 인한 산사태 재난에 선제적으로 대응하여 시민의 생명·재산을 보호하고자 산사태 대책 상황실 운영, 사방사업 등 추진

① 산사태 대책 상황실 운영

□ 운영개요

- 기 간 : '25. 5. 15. ~ 10. 15.(여름철 자연재난 대책기간)
- 근무체계 : 산사태(풍수해) 위기경보 단계별 근무, 24시간 교대 근무
 ※ '25년 비상발령 현황(8.4.기준): 총 34회(보강 19, 비상1단계 13, 비상2단계 2) / 연인원 6,340명
- 피해현황 : 산사태 피해사례 없음('25. 8. 5. 기준)

□ 주요임무 : 자치구 산림재해(산사태, 토석류) 상황관리 총괄

- 기상 및 산사태정보시스템 모니터링, 신속한 상황전파 및 실시간 대응
- ^{산림청}산사태 예방지원본부, ^{서울시}풍수해 재난안전대책본부, 자치구와 상황유지
- 산사태 예측정보 수신 시 자치구별 예·경보 발령 상황보고

② 생활권 산사태 취약지역 중심 산사태 예방사업 추진

□ 사업개요


- 대 상 : 북한산, 용마산, 관악산 등 산지 내 산사태 위험 사면
- 기 간 : '24. 10. ~ '25. 8.
- 총사업비 : 25,381백만원(국비 9,650 / 시비 15,731)
- 내 용 : 총 128개소(^{신규}사방사업 97, 사방시설 보수정비 31)

□ 추진실적 : 127개소 완료

- 사방사업(97개소) : 산림유역(2), 사방댐(17), 계류보전(22), 산지사방(20), 사면정비(36)
 ※ 97개소 중 1개소는(은평구) 8월 말까지 완료, 강우대비 수방자재 비치 등 안전관리
- 사방시설 보수 정비(31개소) 완료



<도봉구 방학동, 사방댐 조성>



<노원구 상계동, 계류보전 및 배수로 정비>

③ 산사태 현장예방단 운영을 통한 현장대응 강화

□ 운영개요

- 기간/규모 : '25. 4. ~ 11. / 25개단 92명(서울시 1개단 3명, 자치구 24개단 89명)
- 관리대상 : 2,870개소(산사태취약지역 516, 사방사업지 2,273, 급경사지 81)
- 사업예산 : 1,455백만원(국비 571 / 시비 884)

□ 주요내용

- 여름철 풍수해 기간 전후 산사태 취약지역 등 현장점검 및 응급조치
 - ※ 풍수해 대비 점검 실적('25.7월 기준) : 점검 1,431개소, 현장조치(준설, 보수) 90개소
- 풍수해 기간 동안 SNS(밴드)로 활동 상황 실시간 확인 및 전파

④ 산사태 예방·대응 교육 및 홍보 등 시민 안전문화 확산

□ 사업개요

- 기 간 : '25. 1. ~ 12.
- 대 상 : 일반시민, 지역주민, 산림 인접 학교 등
- 사업예산 : 52백만원

□ 주요내용


- 산사태 정보 제공으로 예방·대응 활동 시민참여 유도
 - 시민 관심 제고를 위한 홍보물 제작 및 배포
(리플릿 24,000부, 소책자 3,000부 등)
 - 홍보 동영상 5종 배포(옥외전광판, 엘리베이터모니터 등) 및 지하철 모서리 광고(512면) 등
- 시민 스스로 위기 대응능력 함양을 위한 '찾아가는 산사태 예방학교' 운영
 - (대 상) 산지 인접지역, 산사태 발생 시 피해 우려되는 초·중·고교
 - (교육방법) 전문가, 재난지도사가 직접 방문 교육
 - (내 용) 산사태 발생원인 및 징후, 행동요령, 신고방법 등
 - (추진실적) 26개교 6,116명 교육 수료('25.7월 기준)
 - ※ 운영계획 : 34개교 8,622명 예정



4. 사람과 동물이 함께 어울리는 반려환경 조성

4-1. 서울 반려동물 테마파크 · 추모관(연천) 조성

4-2. 올바른 반려동물 문화 조성을 위한 대시민 서비스 확대

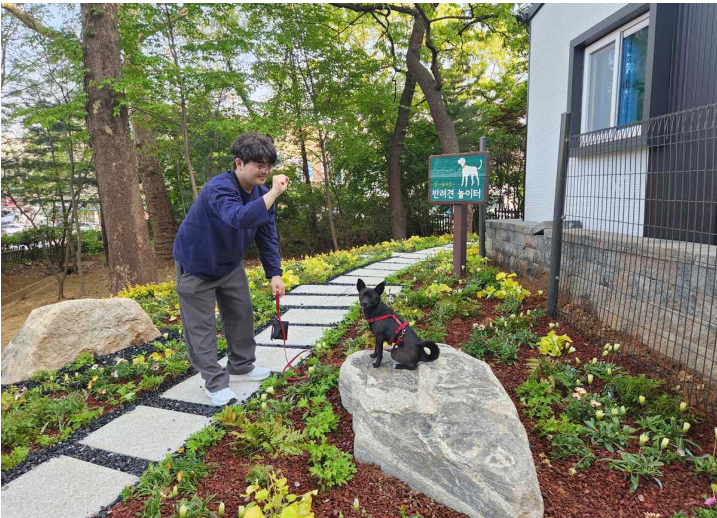

4-1

서울 반려동물 테마파크 · 추모관(연천) 조성

동물보호과장 : 이미숙 ☎2133-7645 동물정책팀장 : 오지현 ☎7647 담당 : 윤민 ☎7649

반려동물 테마파크·추모관을 조성하여 반려인들의 반려동물 동반 여가활동 지원과
반려동물 장례문화 확산

□ 사업개요

○ 주요내용 : 연천군과 협력, 반려동물 테마파크 및 추모관 조성

- ※ 연천군 역할: [테마파크] 부지매각, 기반시설공사(상·하수도), 임진강 하천구역 정비,
부지성토, 행정지원(도시계획시설 변경, 환경·재해영향평가 등)
[추 모 관] 부지매각, 기반시설공사(진입도로, 상수도), 행정지원(주민공청회 등)

○ '25년 예산 : 18,389백만원(설계비, 부지매입비, 공사비 등)

□ 추진현황('25.7월 말 기준)

○ 서울 반려동물 테마파크 조성 추진('27년 완공목표)

- 위치·규모: 연천군 군남면 삼거리 696번지 일대 부지면적 114,995㎡
- 주요시설: 캠핑장, 반려견놀이터, 수영장, 문화센터 등
- 총사업비: 47,685백만원(추정)

- ※ 추진실적('25.7월말): 투자심사, 공공건축심의 등 사전절차 이행('24.2.~6.),
설계용역('24.8.~'25.12.)

○ 서울 반려동물 추모관 조성 추진('27년 완공목표)

- 위치·규모: 연천군 군남면 선곡리 산198 건축연면적 1,219.93㎡ (부지면적 39,273㎡)
- 주요시설: 동물화장장, 봉안당 등
- 총사업비: 8,592백만원(추정)

- ※ 추진실적('25.7월말): 투자심사, 공유재산관리계획 심의 등 사전절차 이행('24.2.~6.),
설계용역('24.9.~'25.12.)

□ 향후계획

○ 테마파크·추모관 기본 및 실시설계 준공 : '25. 12.

- ※ 연천군: [테마파크] 테마파크 환경·재해·교통영향평가('25.10.) 및 부지성토('25.11.)
[추 모 관] 군관리계획(진입도로) 결정고시('25.9.)

○ 테마파크·추모관 착공 : '26. 3.

4-2 올바른 반려동물 문화 조성을 위한 대시민 서비스 확대

동물보호과장:이미숙☎2133-7645 동물정책팀장 :오지현☎7647 담당 : 윤 민 ☎7649
동물복지시설팀장 :배진선☎7696 담당:류성립,김은송☎2124-2832

동물복지 기반시설 확충, 동물보호 교육 확대, 반려동물 문화행사 개최 등을 통해 동물보호 문화 확산 및 인식 개선

① 「반려견 놀이터」 운영 및 확충

□ 사업개요

- 주요내용 : 市 반려견놀이터 운영 및 區 반려견놀이터 조성 지원
- 소요예산 : 265백만원

□ 추진실적('25.7월 말 기준)

- 市 반려견 놀이터 운영(4개소) 및 노후시설 개·보수
 - 보라매공원 반려견 놀이터 정비 공사('25.3월)
 - 어린이대공원 반려견 놀이터 개보수 공사('25.1~4월)

어린이대공원	월드컵공원	보라매공원	매현시민의숲
'13.7.31.개장(747㎡)	'14.4.30.개장(1,638㎡)	'16.4.23.개장(1,300㎡)	'23.6.13.개장(843㎡)
			

- 자치구 반려견 놀이터 조성 1개소 지원 및 조성 완료
 - 성동구 전농 생태하천 반려견 놀이터 개장('25.6.26.)

자치구	도봉	구로	영등포	동대문	송파	마포	강북	성동	마포	은평	금천	구로	성동
개 장	'17.1.	'19.12.	'20.3.	'20.12	'22.1.	'22.4.	'22.9.	'23.12.	'24.6.	'24.6.	'24.6.	'24.10.	'24.6.
위 치 (면적)	초안산 근린공원 (800㎡)	안양천 오금교 남단 (700㎡)	안양천 오목교 (116㎡)	중랑천 장안교 하부 (420㎡)	탄천 유수지 (1,221㎡)	마포동 (372㎡)	북서울 꿈의숲 (815㎡)	중랑천 송정교 하부 (770㎡)	난지한강공원 (2,000㎡)	물푸레공원 (1,300㎡)	안양천 (757㎡)	안양천 (2600㎡)	전농생태 하천 600㎡

※ '25년도 신규 조성 신청 : 중랑(1,000㎡), 강서(630㎡)

□ 향후계획

- 市 반려견 놀이터 운영·관리 : 계속


② 「동물복지지원센터」 운영 및 확충(강동 건립)

□ 사업개요

- 주요내용 : 유기·사육포기·피학대동물의 구조·치료·보호·입양, 반려동물 사회화·동물보호 교육, 사각지대 의료지원 등
- 소요예산 : 2,445백만원 (3개 센터 운영 938, 강동 센터 조성 1,507)

□ 추진실적('25.7월 말 기준)

- 동물복지지원센터 3개소(마포·구로·동대문) 운영
 - 유기·사육포기·피학대 동물 입양·기증(116마리), 검진·중성화 등 치료(2,957건)
 - 반려동물 시민학교(832명), 어린이교육(372명), 센터 자체 교육(1,351명)
 - 민간보호시설 등 의료지원(589마리), 시민자원봉사 활동(5,200명)
 - 입양문화 홍보 캠페인(17회), SNS·유튜브·홈페이지 등 홍보(1,215건)

명 칭	동물복지지원센터 마포 ('17.10.)	동물복지지원센터 구로 ('21.1.)	동물복지지원센터 동대문 ('23.11.)
소재지	마포구 매봉산로 31 (610.5㎡)	구로구 경인로 472 (206.6㎡)	동대문구 무학로 201 (552.9㎡)
시 설			

- 동물복지지원센터 강동 신규 조성 추진 ※ 공사 : '26.12월 ~ '29. 3월

구 분	규 모	
소재지	강동구 길동 12-7	
건축면적	218.04㎡	
연면적	1,363.65㎡	
건물규모	지하1층, 지상3층	

□ 향후계획

- 동물복지지원센터 3개소 운영 : 계속
- 동물복지지원센터 강동 설계 준공 : '25. 9.

③ 「동물보호 및 반려동물 문화」 행사 개최

□ 사업개요

- 주요내용 : 올바른 반려동물 및 동물보호 문화 확산을 위한
반려인능력시험, 동물보호의 날 등 행사개최
- 소요예산 : 550백만원

□ 추진실적('25.7월 말 기준)

- 성숙한 반려인 양성을 위한 반려인능력시험 개최
 - 필기시험 : 강아지(3천명)·고양이(2천명) 부문 각각 기초상식 등 총 50문항
 - 실기시험 : 강아지 부문 필기시험 성적우수자(80팀) 대상 11개 코스
- 반려견과 함께 즐기는 건강한 여가 활동을 위한 도그스포츠 대회 개최
 - 일시·장소 : '25. 9. 20(토).~9. 21(일). 월드컵공원 평화의 광장
 - 행사내용 : 어질리티(장애물 뛰어넘기 등), 캐니크로스(반려견과 연결 후 뛰기) 등
- 동물보호 인식 제고를 위한 동물보호의 날 기념행사 개최
 - 일시·장소 : '25. 10. 18(토).~10. 19(일). 반포한강공원
 - 행사내용 : 반려견과 걷기대회, 유기견 자랑대회, 동물보호 캠페인 등



반려인능력시험(홍단보도 앞 대기)



도그스포츠(어질리티)



동물보호의 날 기념행사(동행런)

□ 향후계획

- 제7회 반려인능력시험 : '25. 9.(필기), 10.(실기)
- 제1회 도그스포츠 대회 : '25. 9.
- 제2회 동물보호의 날 기념행사 : '25. 10.
