

현 안 업 무 보 고

2026. 6.



위레트램운영(주)


1 일반현황

설립근거 및 목적

근거	· 지방공기업법 제54조(다른 법인에 대한 출자) · 위례선 트램 관리운영사업 위·수탁 협약('24. 11. 18.) · 위례선 트램 운영자회사 설립 서울시 승인('26. 5. 8.)
목적	· 위례선 트램 여객운송 및 운임의 징수·관리 · 트램 차량 및 시설물 유지보수 및 관리, 감독

조직 및 인력 ('26. 6. 5. 설립일 기준)

조직	· 사장·1본부·3처 7팀
인력	· (정원/현원) 93명 / 12명 (공사 인력 파견)

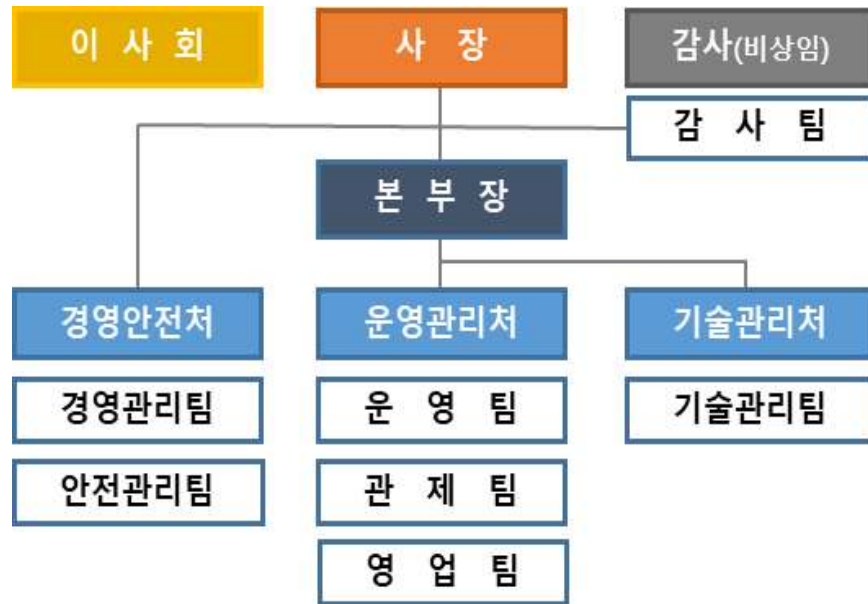

구분	계	임원	경영 안전처	운영 관리처	기술 관리처	감사팀
인원	93명	2명	13명	65명	11명	2명

□ 위례선 트램 사업개요

위례선 트램은 자동차 대중화로 사라졌던 트램(서대문~청량리, 1899~1968)을 현대식 무가선 트램으로 58년만에 국내 1호, 최초 트램으로 다시 부활

○ 총사업비 : 3,503억 (재정사업)

※ LH공사(75%), SH공사(25%) 분담 * 광역교통개선분담금 활용

○ 사업규모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소(송파 7, 성남 5), 기지 1개소,
차량 10편성(5칸), 교량 2개소

- 주요노선 : (본선) 마천~북정 (4.7km) / (지선) 남위례 (0.7km)

※ 서울시 60.7% (3.28km) / 성남시 39.3% (2.12km)

□ 운영계획

○ 운영기간 : 개통일로부터 5년 ('26.12월 개통 예정)

○ 영업시간 : 05:30 ~ 25:00(19시간 30분) ※ 공사 영업시간과 동일 운영

○ 운행시격 : (본선) 첨두5~10분, 비첨두10~15분 / (지선) 첨두15분, 비첨두20분

○ 운임제도 : 수도권 대중교통 통합환승할인제

< 위례선 트램 노선도 >




2 주요 보고사항

1 위례선 트램 개통준비 현황

☐ 직원 채용 계획

- 주요 채용 일정('26.6월 ~ 10월)



※ (市 사전협의 근거) 기타 공직유관단체 채용제도 개선 대책(국민권익위원회, '19.5.)

- 채용 규모 : 약 80명 (경력직 70% 이상 / 공사 파견인력(12명) 제외)

※ (파견자 임무) 경영, 안전, 운영 등 경영·운영 전반 체계 구축 및 노하우 전수

- 직원 처우 : (정년) 61세 / (신입연봉) 약 37백만원(평가급·실적급 별도)

☐ 안전관리 계획

- 안전요원 운영 : (배치)교차로 및 횡단구간, (인원)약 400명, (기간)개통 후 1년

※ (방식) 노인 일자리 활용 / (임무) 보행자 등 교통지도, 긴급상황 전파

- 안전시설 구축 : 전방추돌방지장치*, 영상감시 시스템**, 교차로 안전설비***

* 트램 70m 전방 보행자, 자동차, 장애물 사전 검지 및 검지시 기관사 경고^(미 반응시 긴급제동)

** 교차로 및 정거장 내 승객 동선 및 이벤트 실시간 감시^(화재 등)

*** 트램 진입 중 장애물 검지시 관제 경보, 보행자 경고^(음향), 차량 운전자 주의경고^(시각)

- 지역주민^(노약자, 어린이 등) 트램 숙달 안전교육 지속 실시

※ 유튜브 영상 업로드, 송파안전교육체험관 시민안전 교육, 팜플릿, 이용안전 수칙

2

본선 시운전 및 철도종합시험운행계획

□ 본선 시운전 시행

- 목 적 : 트램 차량의 본선 실제 운영환경에서 성능 및 안전성 검증
- 개 요 : (연장)5.4km, (정거장)12개소, (차량)10편성, (개시)'26. 2. 1.
- 시험기관/감독/시행 : 한국철도기술연구원 / 도기본, 감리단 / 서교공*

* 투입인원 : 총 8명(공사 2명, 용역사 6명) / 현재 6개 편성 시운전 중

□ 철도종합시험운행 계획

○ 사업 개요

- 대 상 : 총 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소
- 일 정 : 2026. 4. 1. ~ 12. 24. (9개월)
- 주 관 : 도시기반시설본부, 서울교통공사(위례트램운영)

○ 주요 절차 및 일정

구분	공종별 시 험	사전점검	시 설 물 검증시험	영 업 시운전	종합보고
일정	'26.4.1. ~6.24. (85일)	'26.6.25. ~7.20. (26일)	'26.7.21. ~10.3. (75일)	'26.10.4. ~12.2. (60일)	'26.12.3. ~12.24. (22일)
주관	서울시 (도기본)	서울시 (도기본)	서울시 (도기본)	서울교통공사 (위례트램운영)	서울시 (도기본)
지원	-	서울교통공사 (위례트램운영)	서울교통공사 (위례트램운영)	서울시 (도기본)	-
